

# 工事請負契約における 設計変更ガイドライン

2019年7月

首都高速道路株式会社

## 目次

1.策定の背景	1
2.用語の定義	3
3.設計変更等の手続き	5
4.設計図書照査及び設計図書変更等に係る業務	8
5.設計図書の訂正又は変更の実施者	12
6.設計変更の対象となるケース	13
7.設計変更の対象とならないケース	17
8.入札・契約時の設計図書等の疑義の解決	18
9.仮設・施工方法における「指定」・「任意」の使い分け	19
10.受発注者間のコミュニケーション	21
11.新規工種を設計変更により追加する場合の積算比率の取り扱い	24
<b>【巻末資料】</b>	
I 設計図書の照査項目一覧表	27
II 当社での工事契約方式	36
III 設計変更事例	38
IV 工事変更合意書(様式)	61
V 参考資料	62

改訂年月	改訂内容
平成 27 年 5 月 (2015 年 5 月)	「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン」として新規制定
平成 28 年 7 月 (2016 年 7 月)	道路付帯設備工事及び営繕工事の内容を含めて、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」として改訂 ・臨機の措置について明記 ・設計変更の対象となるケースの事例を追加 ・設計変更することの妥当性に迷った事例に共通事例を追加
平成 29 年 5 月 (2017 年 5 月)	・工事変更合意書の定義等を追加 ・設計変更の対象となるケースの事例を追加 ・三者会議及びワンデーレスポンスの取組みも有効と明記
平成 30 年 7 月 (2018 年 7 月)	・照査範囲を超える業務の具体例を追加 ・受発注者間のコミュニケーションとして三者会議及びワンデーレスポンスの目的及び実施方法等について追加 ・設計変更にあたっての判断理由及び協議内容等の事例の追加
2019 年 7 月	・新規工種を設計変更により追加する場合の積算比率の取り扱いを追加 ・当社での工事契約方式を改訂



## 1.策定の背景

### (1)請負工事の特徴

当社は高度に市街化された首都圏で建設、改築、維持管理事業を行っていることから、それらに係る工事では地形・地質などの自然条件だけでなく、周辺環境、地下鉄や種々のライフライン、交通規制などの様々な制約条件に対応を求められる都市内工事となっている。

首都高速道路は、現在供用している延長約 310km のうち、高架やトンネルなど構造物によってつくられている割合が約 95%を占めており、特に近年、環境保全の観点から中央環状新宿線、中央環状品川線、横浜環状北線、横浜環状北西線などにおいては、トンネル構造が主体に採用されている。また、供用 30 年以上経過している路線は、全体の約 5 割となっており、大型車の利用交通が多いこともあり、構造物の疲労や老朽化が大きな問題となっている。特に、それらの損傷が顕著な箇所については大規模更新・大規模修繕が今後進められることとなっている。

以上のように、当社の工事は都市内高速道路という特殊性や様々な制約から、当初予見できない事態(例えば地元対応、関係機関との調整、ライフライン等の支障物による対応)により、当初設計を変更せざるを得ない状況が発生し、受注者との変更の協議に多くの時間と労力を費やし対応してきた。今回、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」を策定することにより、あらかじめ設計変更の前提条件を整理し、設計変更となる場合、ならない場合について例示し、今後の発注者と受注者との円滑な設計変更に備えることとしたものである。

### (2)設計変更の現状と課題

契約書類に明示されている内容と実際の現場条件が一致しない場合、または関係機関との協議や地元対応の理由から当初設計を変更せざるを得ない場合には契約書類の関連条項に基づき、設計図書に明示した内容を変更し、本来ならば併せて金額変更が必要である。但し、下記のようなケースのときに設計変更にあたるかが問題とされ、発注者と受注者間で設計変更の適否について主張が異なり、問題となる場合がある。

- ・ 契約書類において、本来なされるべき条件明示をしておらず、そのために設計変更の対象となる事象を明確に特定できないために、設計変更として判断できない。
- ・ 事前に発注者と受注者間で必要な「協議」がなされずに現場の施工が行われ、設計変更として認められない。
- ・ 「任意仮設」であるため、発注者側での当初設定内容が現地条件と大きく乖離しているにもかかわらず、受注者から設計の変更を求められても変更しない。
- ・ 契約書類の内容に不整合があり、受注者が行う設計書照査について、受注者の責任を越える過度の負担が求められる場合があり、発注者と受注者との間の認識の相違があっても変更しない。
- ・ 様々な理由により、契約書類の条件を見直す必要があり、設計図書の変更を行う必要が生じたにも関わらず、発注者と受注者との間の認識の相違により変更しない。

### (3)適切な設計変更の必要性

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第 3 条「基本理念」に「公共工事の品質確保に当たっては、公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するように配慮されなければならない」が示されており、設計変更においても、より良い社会資本の整備のために、発注者・受注者それぞれの役割分担を適切に行ったうえで、設計変更内容について両者が合意し契約を締結することが不可欠と考える。

また、建設工事や補修補強工事の施工に関しては、各種の条件変更等に伴い当初設計の変更を余儀なくされるものであることから、適切な契約変更手続きを行うとともに、受発注者の業務(費用)分担を明確化し、適正な工事履行体制を確保する必要がある。

工事管理における受発注者間の信頼関係を取り戻し、より良い工事目的物の構築を推し進めるため、「設計図書の照査」、「設計図書変更等に係わる業務」、「設計変更が可能なケース」及び「設計変更の手続き」等について、発注者と受注者の双方が十分理解しておく必要がある。

## 2.用語の定義

### (1)設計変更の定義

本ガイドラインにおける「設計変更」とは、工事請負契約書第18条、又は第19条に基づき設計図書を変更する手続きを行うことを言う。

### (2)契約変更の定義

本ガイドラインにおける「契約変更」とは、設計変更の手続きを行った後に契約書類の内容を変更する手続きを行うことを言う。

### (3)契約書類等の用語の定義 工事共通仕様書 1.1.2)

契約書類	工事請負契約書及び設計図書をいう。
設計図書	図面、仕様書、工事請負現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び金額を記載しない設計書をいう。
図面	入札等に際して、当社が示した設計図、当社から変更又は追加された設計図、設計図の基となる設計計算書等をいう。ただし、実施設計を含む工事にあつては、契約書類及び監督職員の指示に従って作成され、当該監督職員が認めた実施設計の成果品の設計図を含むものとする。
仕様書	各工事に規定される特記仕様書と各工事に共通する共通仕様書を総称していう。
特記仕様書	共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める書類をいう。
共通仕様書	各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した書類をいう。
工事共通仕様書	土木工事共通仕様書、建築工事共通仕様書、電気設備工事共通仕様書、機械設備工事共通仕様書、建築維持補修工事共通仕様書、電気設備保全業務共通仕様書及び機械設備維持補修工事共通仕様書を総じていう。
工事請負現場説明書	工事の入札に参加するものに対して、当社が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
現場説明に対する質問回答書	工事請負現場説明書及び現場説明に関する入札参加者等からの質問書に対して、当社が回答する書面をいう。
金額を記載しない設計書	設計書において、数量及び条件のみを明示した書類をいう。
営繕工事	建物の建築工事、電気設備工事及び機械設備工事をいう。
工事変更合意書	追加工事又は変更工事(工事の一時中止に伴う中止期間中の工事現場の維持、工事体制の縮小及び工事の再開準備を含む。以下「追加工事等」という。)の全体数量等の内容が、工事状況によりその着工前の時点で確定できない場

合、その都度追加・変更契約を締結することが不合理な場合において、追加工事等の着工前までにその工事内容等を合意するために受発注者間で取り交わす書面をいう。


その他、工事契約方式によって、以下の書類を契約書類として工事請負現場説明書に定める場合がある。工事を契約する際には、工事請負現場説明書の記載を確認して、適切に工事の履行を進める必要がある。

- 基本条件図書 工事目的物の線形や必要幅員などの仕様や、工事の施工に関して制約される条件を記載した書類
- 技術提案書 工事の受注に際して受注を希望するものが施工する際に品質の向上や施工金額を低減させるために行う工夫をまとめた書類

#### (4)契約書類の体系


工事の請負契約において発注者と受注者を拘束する契約書類の体系は次のとおり。

(工事請負契約書第1条)

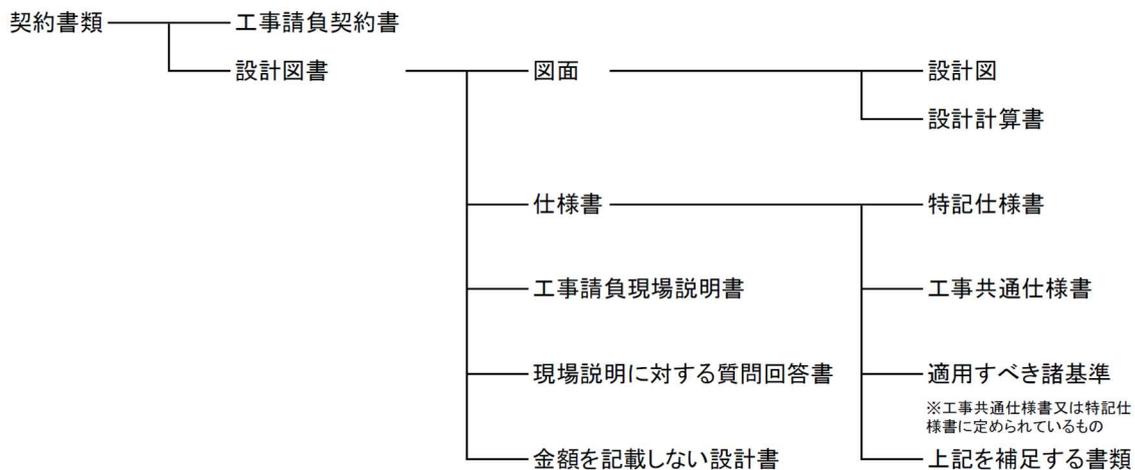

### 3.設計変更等の手続き

#### (1)設計変更の手続きフロー(全般)

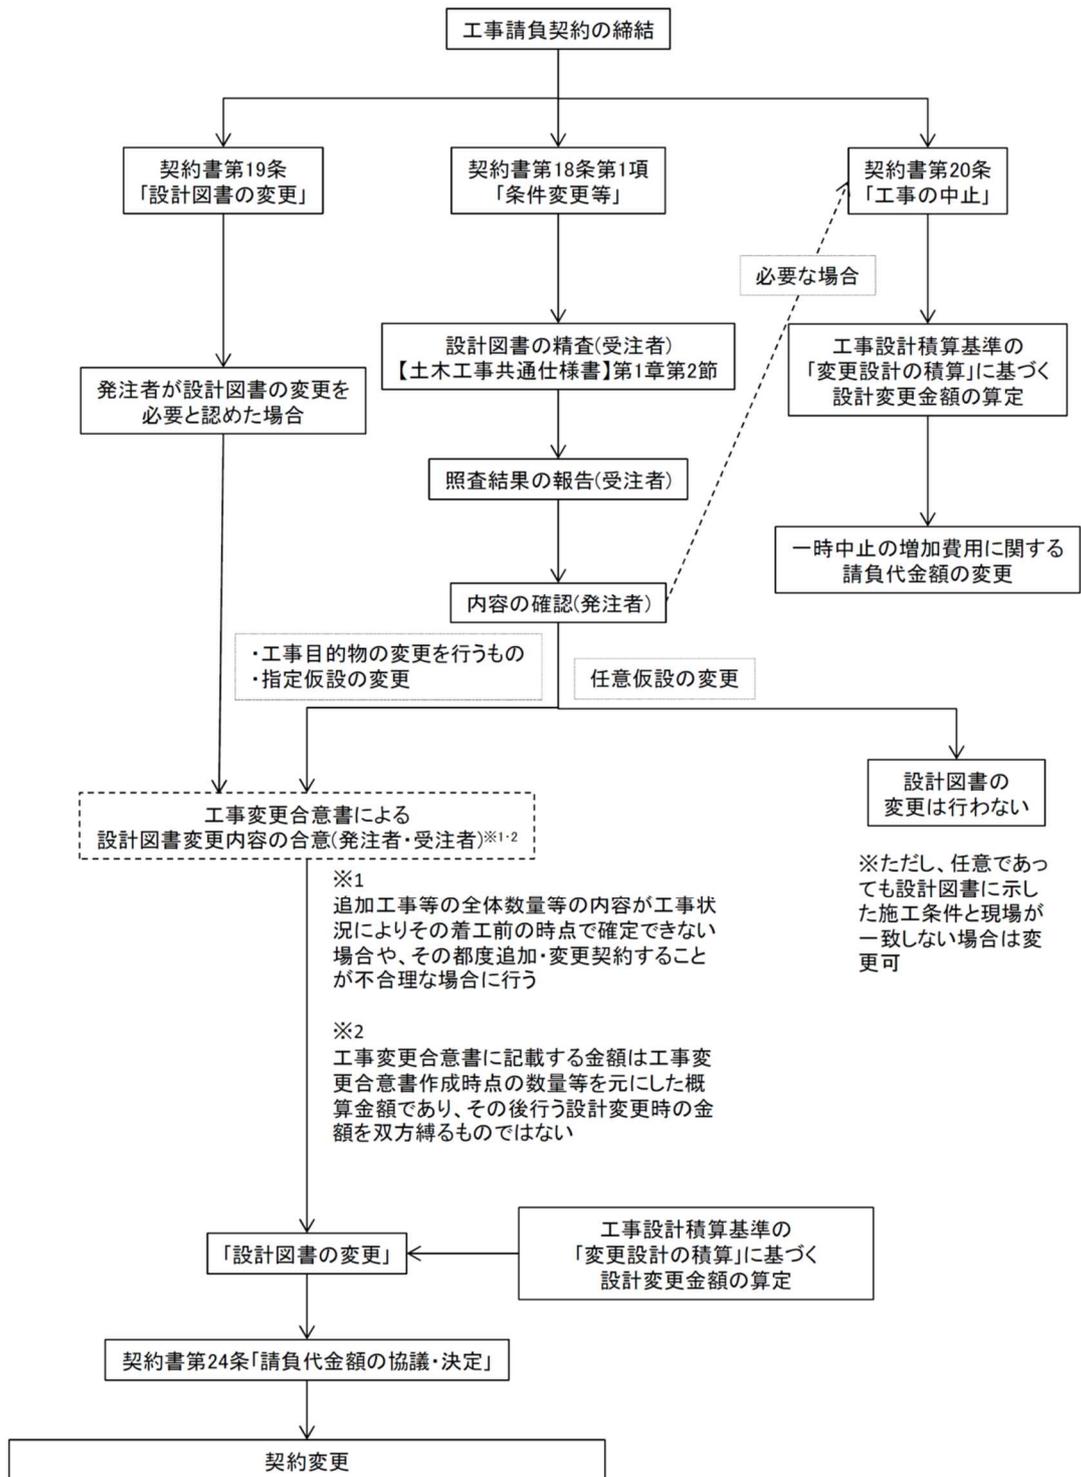

**【臨機の措置について】**


災害等で緊急を要する場合は、「工事請負契約書第 26 条(臨機の措置)」、及び「土木工事共通仕様書 1.1.42」に基づき受注者は臨機の措置を取らなければならない。その場合、速やかに「土木工事共通仕様書 1.1.15.5」により工事打合せ簿の処理を行う。その後、「工事請負契約書第 26 条第 4 項」により発注者が負担することとなった場合は、設計図書の変更を行う。

**【工事変更合意書について】**

追加工事等の発生により当初の請負契約書に掲げる事項を変更するときは、「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」(平成 23 年 8 月)(国土交通省 土地・建設産業局建設業課)に定めがある通り、原則として追加工事等の着工前に契約変更を行うこと。

追加工事等の全体数量等の内容が、工事状況によりその着工前の時点で確定できない場合、その都度追加・変更契約を締結することが不合理な場合は、追加工事等の着工前までに工事変更合意書を受発注者間で取り交わすこと。なお、契約変更等の手続きについては、追加工事等の内容が確定した時点で遅滞なく行うこととする。

(2)設計図書照査に基づく設計変更時の受発注者間の手続フロー

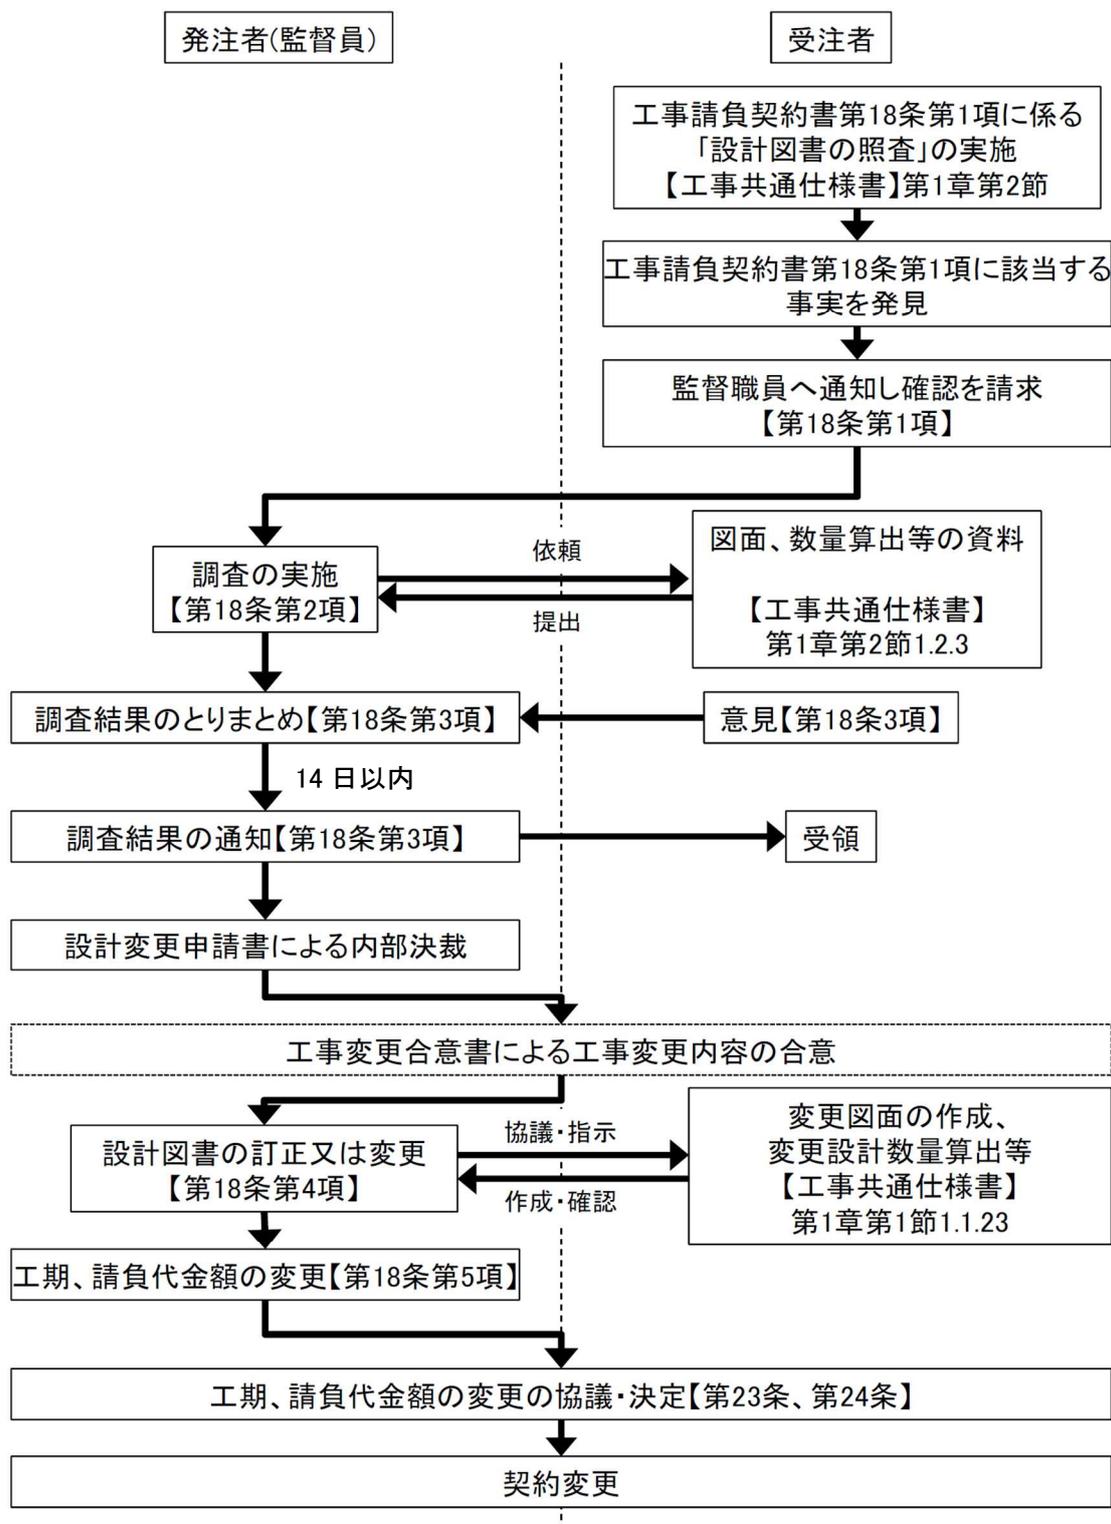

## 4.設計図書照査及び設計図書変更等に係る業務

### 4.1 設計図書照査と設計図書変更の位置づけ

「設計図書の照査」及び「設計図書の変更」のそれぞれの位置付けは下図のとおりである。

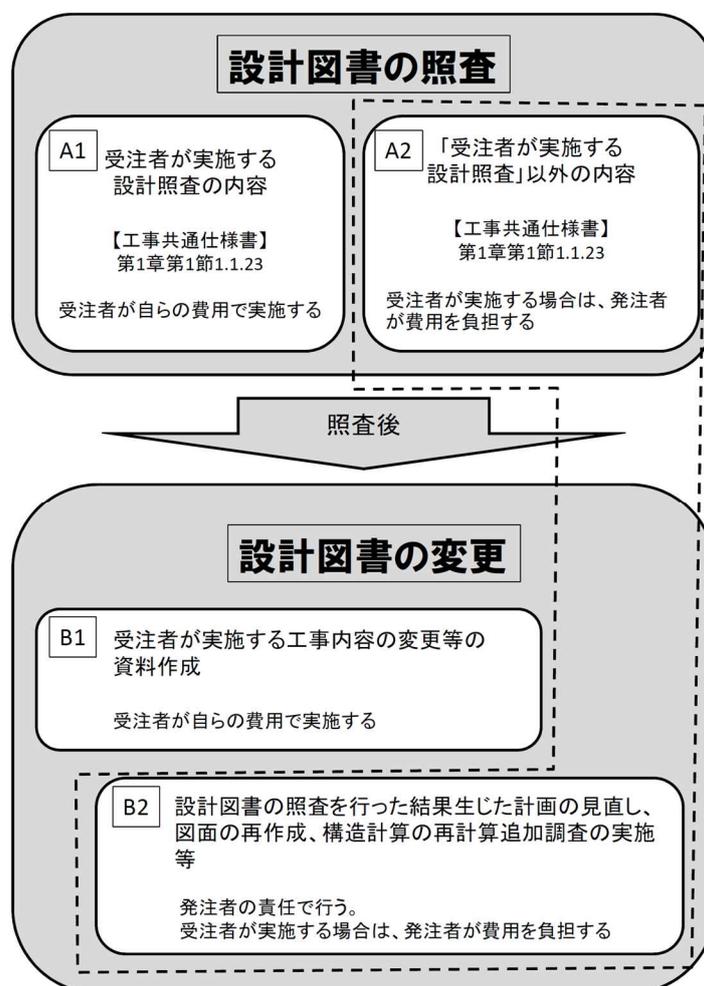


図 1

### 4.2 設計図書の照査に係る業務

#### (1) 受注者の費用で実施する設計図書照査に係る業務

図 1 の A1 に示す受注者が自らの費用で実施する設計図書の照査については、工事請負契約書及び工事共通仕様書において、以下の通り義務付けられている。具体的には、巻末「設計図書の照査項目一覧表」の該当する工種の照査項目について実施するものとする。なお、照査時に行う軽微な比較検討等は、受注者が自らの費用で実施する設計図書照査に含まれる。

- ① また、一覧表の対象工種以外についても本ガイドラインに準拠できるものであれば、発注者と受注者で協議のうえ、運用できるものとする。工事請負契約書における記載内容

【工事請負契約書第 18 条第 1 項(条件変更等)】

受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を

直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

- 一. 図面、仕様書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
- 二. 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
- 三. 設計図書の表示が明確でないこと。
- 四. 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
- 五. 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

## ② 工事共通仕様書における記載内容

### 【工事共通仕様書】第1章第2節 照査 1.2.1 計算書等の照査

1 受注者は、工事の着工前に、線形座標計算書、工事的目的物の応力計算書、材料計算書及び図面(以下、「計算書等」という。)の照査を行わなければならない。ただし、実施設計付き工事における実施設計の照査は、調査・設計共通仕様書 8.3.5(照査)によるものとする。

### 【工事共通仕様書】第1章第2節 照査 1.2.3 計算書等照査報告書及び照査表

受注者は、計算書等の照査について作業内容等の結果をまとめ、「計算書等照査報告書」及び「計算書等照査表」を提出し、監督職員の確認を求めなければならない。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は、これに従わなければならない。

なお、監督職員が求めることができる資料の範囲は工事共通仕様書 1.1.23 条件変更等の処理に示す。

### 【工事共通仕様書】第1章第1節 1.1.23 条件変更等の処理

- 1 受注者は、契約書第 18 条第1項に規定する事実を発見し、当社に確認を請求するときは、「工事打合せ簿」にその内容を記載して、提出しなければならない。
- 2 受注者は、監督職員の指示に従い、自らの費用により次に掲げる作業を行わなければならない。
  - (1) 契約書第 18 条第4項各号に規定する工事内容の変更又は設計図書の変更を行うために必要な図面の作成(測量図を含む。)、数量算出、試験結果等の資料作成及び整理
  - (2) 前号の資料作成に必要な簡易な構造物の設計
  - (3) その他必要資料及び前2号に準ずる資料の作成

## (2) 発注者の費用で実施する設計図書照査に係る業務

図1の **A2** に示す受注者が作成する更なる追加資料において、新たな比較設計や構造計算、現地計測等を監督職員が指示した場合に発生する費用は、発注者の負担において実施するものとし、以下に具体例を示す。

- ① 「設計要領」や「各種示方書」等との対比設計
- ② 構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照査
- ③ 発注後に構造物などの設計根拠まで遡る見直し、必要とする工事費の算出
- ④ 指定仮設構造物の代替案の比較設計資料と変更図、数量計算書の作成に該当するもの。
- ⑤ 詳細設計に反映させるために行う既設構造物の現地計測
- ⑥ 構造物を設置するために必要な現地計測

### 4.3 設計図書の変更に係る業務

#### (1)受注者の費用で実施する設計図書の変更に係る業務

図1のB1に示す監督職員からの指示に基づき、受注者の負担で実施すべき設計図書の変更に係る業務は以下のとおりである。

下記の内容以外の業務は、受注者本来の業務の範囲を超えるものとし、次項(2)の取扱いとなるため、業務実施段階に受発注者間で取扱いについて確認するものとする。

#### ①工事材料に関する調査試験

品質管理基準に含まれる試験で共通仮設費の技術管理費に含まれるものを示す。(道路付帯機械設備工事は間接製作費及び共通仮設費の技術管理費に含まれるもの、建築工事は共通仮設費のその他項目に含まれるものを示す。)

#### ②測量等現地状況の調査

共通仕様書 1.3.1 現場測量に基づく現場地形図を作成するための測量調査等で共通仮設費の準備費に含まれるものを示す。

#### ③設計、図面作成及び数量の算出

監督職員より条件変更に該当する調査結果の通知と設計図書の変更または訂正に係る通知を受けた場合の作業で共通仮設費の技術管理費に含まれるものを示す。なお、技術管理費に含まれる範囲は、現地取り合いに係る軽微な図面等の変更程度とする。(道路付帯機械設備工事は共通仮設費の技術管理費及び設計技術費に含まれるもの、営繕工事は共通仮設費のその他項目及び現場管理費の施工図等作成費に含まれるものを示す。)

#### ④観測業務

軟弱地盤等での動態観測における施工計画書の作成、周辺地盤変動観測、報告書の作成で共通仮設費の技術管理費に含まれるものを示す。

#### ⑤施工方法の検討

条件変更に伴い施工方法の変更が生ずる場合に行う概略の工法比較資料の作成で、工法選定の基礎となる作業で共通仮設費の技術管理費に含まれるものを示す。

#### ⑥変更設計図面の作成

工事目的物の変更を反映した変更設計図面の作成で共通仮設費の技術管理費に含まれるものを示す。(営繕工事は現場管理費の施工図等作成費に含まれるものを示す。)

- ⑦ 施工計画書の立案、工事の安全対策等に関わる調査(工事共通仕様書 1.3.3 工事に伴う調査)
- ⑧ 仮設施工方法等その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段に関わること(仮設構造計算、関係官庁等届出に必要な資料の作成費用)(工事共通仕様書 1.4.12 工事中仮設構造物等)
- ⑨ その他資料の作成及び上記に準ずる作業その他共通仮設費に含まれるものを示す。

## (2) 発注者の費用で実施する設計図書の変更に係る業務

図 1 の **B2** に示す受注者の費用で行う設計図書の変更に係る業務の範囲を超える作業の内容は以下のとおりで、発注者が費用を負担するものとする【共通仕様書 1.1.23 条件変更等の処理】

- ① 応力計算又は比較検討等を必要とする高度な設計
- ② 応力変位計測、地下水位等の動態観測等
- ③ 現地測量や関係機関との協議により大幅な変更が生じたことによる図面の作成及び修正(ただし、受注者の技術提案等により施工方法の変更を行った場合などは除く。)
- ④ ボーリングを必要とする地質調査
- ⑤ 現位置での地質調査等により変更が生じたことによる設計計算及び図面作成
- ⑥ 現地条件や施工条件に変更が生じたことによる設計計算及び図面作成(ただし、受注者が提案し監督職員が承諾して変更するものは除く。)
- ⑦ 設計図と設計計算書に相違がある場合の設計計算及び図面作成
- ⑧ 新たな工種追加により変更が生じたことによる設計計算及び図面作成
- ⑨ 実施設計により変更が生じたことによる設計計算及び図面作成
- ⑩ 要領等の変更が生じたことによる設計計算及び図面作成
- ⑪ 照査の結果必要となった追加調査

### <例>

- ・ ボーリング調査 (上記④)
- ・ 杭打・大型重機による施工を行う際の近隣の家屋調査 (上記⑪)
- ・ 地盤改良の薬液注入工の施工に係る周辺地域への影響調査 (上記⑪)
- ・ 路床安定処理工における散布及び混合を行う際の粉塵対策(上記⑧)
- ・ 移設不可能な埋設物対策(上記③)

## 5.設計図書の訂正又は変更の実施者

設計図書の訂正又は変更は、契約書第 18 条第 4 項のとおり、発注者が行わなければならない。

なお、第 1 項第 4 号又は 5 号に該当し、設計図書を変更する場合、工事目的物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議のうえ、発注者が行うものとする。

### 【工事請負契約書第 18 条第 4 項】

4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

### 【工事請負契約書第 18 条第 1 項】

- 一 図面、仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
- 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
- 三 設計図書の表示が明確でないこと。
- 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
- 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

## 6.設計変更の対象となるケース

以下のような場合については、設計変更の対象とする。

ただし、本項に記載しているケースは、当初契約において技術提案を求める工事範囲には適用しない。

### ① 図面と仕様書が一致しない場合(契約書第 18 条第 1 項一)

設計図書は、特記仕様書、工事請負現場説明書、現場説明に対する質問回答書、図面、共通仕様書、金額を記載しない設計書の順に優先適用する。(工事共通仕様書 1.1.3)

#### 【事例】

- イ) 設計書と図面で材料の規格が一致しない。
- ロ) 図面と設計書(金抜き)の材料の寸法、規格、数量等の記載が一致しない。
- ハ) 平面図と縦断図の延長、材料名称、仕様等の記載が一致しない。

### ② 設計図書に誤謬又は脱漏がある場合(契約書第 18 条 1 項二)

設計図書の誤り、設計図書に表示すべきことについて表示されていない場合

#### 【事例】

- イ) 条件明示する必要があるにも係わらず、土質や地下水位に関する一切の条件明示がない。
- ロ) 設計図書に示されている施工方法では、条件明示されている土質に対応できない。
- ハ) 設計図書に記載されている材料の規格が間違っている。
- ニ) 設計図書に使用材料の規格が記載されていない。
- ホ) 一式工事について、図面、仕様書又は現場説明書に設計条件又は施工方法に係る必要事項が記載されていない。
- ヘ) 条件明示する必要があるにも係わらず、交通誘導警備員についての条件明示がない。
- ト) 図面に設計寸法の明示がない。
- チ) 工事施工上必要な材料名について、図面ごとに一致しない。
- リ) 関連工事の設計内容が互いに整合していない。

### ③ 設計図書の表示が明確でない場合(契約書第 18 条 1 項三)

設計図書の表示が抽象的な表示で、実際の工事の施工に当って判断し得ない場合

#### 【事例】

- イ) 土質柱状図は明示されているが、地下水位が不明確な場合
- ロ) 使用する材料の規格(種類、強度等)が不明確な場合
- ハ) 用地買収が未了との記載はあるが、着工見込み時期の記載がない。
- ニ) 図面と工事数量総括表の記載事項が合致しない。
- ホ) 仮橋の参考図は明示されているが、荷重条件や制約条件等の設計条件の明示がない。

④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない場合(契約書第 18 条第 1 項四)

自然的条件とは、一般的には地質、湧水等の状態、地下水の水位などがあり、人為的条件には、地下埋設物、地下工作物、工事用道路の指定等がある。

【事例】

- イ) 設計図書に明示された土質(地形)や地下水位が現地条件(現場)と一致しない。
- ロ) 設計図書に明示された地盤高が工事現場(の地盤高)と一致しない。
- ハ) 設計図書に明示された地下埋設物の位置が工事現場と一致しない。
- ニ) 設計図書に明示された交通誘導警備員の人数等が規制図と一致しない。
- ホ) 関係機関等による制約が課せられた場合
- ヘ) 設計図書の訂正・変更で、現場条件と一致しない場合
- ト) 施工中に設計図書に示されていないアスベスト含有建材を発見し、調査及び撤去が必要となった場合
- チ) 設計図書に明示された配管・配線等と実施の工事現場における配管・配線等が大きく異なる事実が判明した場合

⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合(契約書第 18 条第 1 項五)

上記④に示した自然的条件について設計図書に明示しておらず、しかも周辺の状態からして特に予想し得なかった場合である。

同様に、人為的条件としては、予想し得なかった騒音規制、交通規制等のほか、埋蔵文化財の発見等がある。

【事例】

- イ) 施工中に埋蔵文化財が発見され、調整が必要となった。
- ロ) 工事範囲の一部に埋設物があり、地盤改良が必要となった。
- ハ) 施工中に地中障害物を発見し、撤去が必要となった。

⑥ 発注者が変更の必要があると認め、設計図書の内容を変更する場合(契約書第 19 条)

現契約の内容を極端に逸脱しなければ、発注者の意思で変更できることを認めたもの。

【事例】

- イ) 地元調整、関係機関協議の結果、施工範囲、施工内容、施工日・時間の変更を行う場合
- ロ) 新たに(同時に)施工する必要がある工種が判明し、その工種を追加する場合
- ハ) 警察・河川・鉄道等の管理者、電力・ガス等の事業者、消防署等との協議により施工内容の変更、工事の追加を指示する場合
- ニ) 関係機関等による制約が課せられた場合
- ホ) 当初設計で指定していた建設副産物の処分先を変更する場合

- へ) 使用材料を変更する場合
- ト) 関連する工事の影響により施工条件が変わったため、施工内容を変更する場合
- チ) 隣接工事との調整で、交通誘導警備員の人数を変更する場合
- リ) 工事現場の安全管理上、フェンス等の防護施設(共通仮設費の率計上分以外)を必要と判断し追加する場合
- ヌ) 条件変更により、詳細設計のやり直しや追加設計を行う場合

⑦ 「設計図書の照査」が照査の範囲を超える場合

受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合  
 工事共通仕様書 1-5-2「設計図書の照査」には応力計算を伴う照査まで求めるものではない。  
 ※本ガイドライン『4.1.(2)「設計図書の照査の範囲を超えるもの」参照

⑧ 受注者の都合により材料承諾又は施工承諾が提出された場合

受注者の都合により材料承諾願又は施工承諾願が提出された場合、設計図書(設計図面・仕様書)に示す工事目的物の形状寸法や材料規格が同等以上と判断されるものについて、しかるべき理由があり、特段支障が無い時は、承諾を与え工事目的物の変更を行うケースがある。この場合、設計図書と工事目的物は同一のものでなければならないことから、工法変更により設計図面や仕様書を変更する。

材料(施工)承諾は、受注者の都合に配慮した行為であるが、設計承認図は、しゅん功図に反映され管理段階の維持修繕業務や改良工事、将来の拡幅工事等に使用される重要なものであり、適切かつ正確に記載しなければならないため、記載漏れ防止のためにも工法変更手続きが必要となる。なお、コンクリートにおける混和剤量の一部変更など、将来、管理上影響がないと認められるものは、この限りではない。

⑨ 工事の全部又は一部の施工について総括監督員が一時中止を指示した場合(契約書第 20 条)

受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害が生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、監督職員は「契約書第 20 条」の規定により工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。

監督職員は、工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、受注者から中止期間中の増加費用の負担について発注者に協議があり、かつ必要があると認められるときは、増加費用の負担を行う。

また、工事標準歩掛(土木編)第2章 8-6-1 等に記載のあるとおり、工事一時中止とならない場合でも、発注者の理由により工期を変更し発注者が必要と認めた場合、共通仮設費における営繕費や現場管理費における労務管理費等、その他現場維持にかかわる費用については別途計上することが出来る。費用については、工事一時中止の場合と同様に受発注者間で協議のうえ計上する。

なお、変更工程表及び理由書のみで工期の変更契約を行った場合、さかのぼって共通仮設費における営繕費や現場管理費における労務管理費等、その他現場維持にかかわる費用を計上することは出来ない。

⑩ 発注者の請求による工期の短縮をした場合(契約書第 22 条)

工事請負契約書第 22 条(発注者の請求による工期の短縮等)に記載のとおり、発注者が工期の短縮を請求する場合は、発注者は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、または損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

⑪ 賃金又は物価の変動により請負代金が不相当となった場合(契約書第 25 条)

発注者又は受注者は、工期内で請負締結の日から 12 カ月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不相当と認めた場合、相手方に対して請負金額の変更を請求できる。

⑫ 第三者等への災害防止のため受注者判断で緊急やむを得ずその対応をした場合(契約書第 26 条)

受注者は、災害防止のため「臨機の措置」をとった場合、その対応内容を発注者に直ちに通知する。

発注者は、受注者が要した費用のうち、必要と認めた部分について負担を行う。

## 7.設計変更の対象とならないケース

以下のような場合においては、原則として設計変更できない。

(ただし、契約書第 26 条「臨機の措置」で対応するような災害時等の緊急性を要する場合はこの限りではない)

なお、本項に記載しているケースは、当初契約において技術提案を求める工事範囲には適用しない。

① 契約書類に条件明示のない事項において、発注者からの「協議」又は「指示」等の通知がなく、受注者が独自に判断して施工を実施した場合

受注者は、契約書第 18 条第 1 項に該当する事項等を発見したときは、その事実が確認できる資料を書面により発注者(監督職員)に提出し、確認を求める。

② 発注者との協議が整う前に施工を実施した場合

契約書第 18 条第 3 項の規定により、発注者は調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知することになっており、速やかな通知は発注者の責務である。しかしながら、協議内容によっては各種検討・関係機関との調整等により、やむを得ず受注者の意見を聴いた上で通知を延期する場合もある。その為、受注者はその事実が判明次第、出来るだけ早い段階で協議を行うことが重要である。

③ 工事請負契約書・工事共通仕様書に定められた所定の手続きを経ていない場合(契約書 18 条～24 条、共通仕様書 1.1.23～1.1.25)

発注者及び受注者は、協議・指示、工事の変更、一時中止、請負代金額の変更など所定の手続きを行う。

④ 書面によらない場合(口頭のみ指示等)

受注者は、書面による指示があるまで施工を実施しない。ただし、緊急を要する場合その他の理由により発注者(監督職員)口頭による指示等を行った場合はこの限りではない。発注者は、口頭指示をした施工内容について後日書面による指示を行う。

## 8.入札・契約時の設計図書等の疑義の解決

設計図書等に係る疑義については、下記により、入札前の段階、契約後の設計図書の照査段階で解決しておくことが、スムーズな設計変更に繋がることになる。

### 【入札前】

工事の入札にあたっては、図面、仕様書、工事請負契約書(案)、その他工事請負現場説明書に定める契約書類等をよく確認の上、入札書を提出するものとする。

入札参加者は、仕様書、図面、契約書(案)、現場説明書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において設計図書等について疑義があるときは、担当部署へ質問書を提出し、その回答を求めることができる。

### 【契約後】

受注者は、施工前及び施工途中において、受注者の負担により契約書第 18 条第 1 項一から五に係わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。また、受注者は監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。(共通仕様書第 1 章第 2 節照査 1.2.3)

また、受発注者間のコミュニケーション促進のために実施している取組みについては、「10.受発注者間のコミュニケーション」を参照。

## 9.仮設・施工方法における「指定」・「任意」の使い分け

### (1)「指定」・「任意」の定義

仮設・施工方法の指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項の定めを踏まえ、その取扱いについては適切に対応していく必要がある。

#### 【工事請負契約書第1条第3項】

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任と費用において定める。

仮設、施工方法の「指定」とは、上記の記載における「契約書及び設計図書に特別の定めがある」場合を指し、これは発注者が構造・施工法を指定していることを意味している。

また、仮設、施工方法の「任意」とは、その「定めがある場合を除いた場合」を指し、受注者が自らの責任で施工法を決め、施工することである。

任意の仮設・施工方法等については、その仮設、施工方法の一切の手段の選択は受注者の責任で行うものであり、その仮設、施工方法に変更があっても原則として設計変更の対象とならない。

ただし、設計図書に示された施工条件と実際の現場が一致しない場合は設計変更の対象となる。

### (2)仮設・施工方法における「指定」・「任意」の適用

「公共工事の発注における工事安全対策要綱」(平成4年7月1日、建設省技術審議官通達)に以下の記載がある。

#### 【公共工事の発注における工事安全対策要綱】

##### 5 適正な仮設工及び施工方法の選定

(1)工事の発注にあたって、次に示すような施工条件の仮設工については、設計図書において指定仮設とすること。

- イ 河川堤防と同等の機能を有する仮締切の場合
- ロ 仮設構造物を一般交通に供する場合
- ハ 特許工法又は特殊工法を採用する場合
- ニ 関係官公署等との協議等により制約条件のある場合
- ホ その他、第三者に特に配慮する必要がある場合

上記に該当する施工条件での工事は、指定仮設とする必要がある。また、指定仮設とする場合は、金抜き設計書においては、仮設を一式計上することなく、内訳書・代価表において仮設材料、方法を明示する必要がある。

反対に、仮設を任意とする場合は、仮設を一式計上とし、必要に応じて特記仕様書にその旨を記載する必要がある。


ただし、施工方法の変更も含めた技術提案を求めている場合は、首都高からの指定行為ではなく  
なるため承認行為の対象外となり、任意仮設と判断できる。ただし、契約後に施工計画書の一部とし  
て受領する場合は、構造計算等も含めて安全性の確認は発注者の責務として必要である。

## 10.受発注者間のコミュニケーション

### (1)三者会議

#### ① 目的

工事目的物の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、工事着手前等において、発注者、設計者、施工者の三者による会議を実施し、設計思想の伝達及び情報共有を図る取組みである。

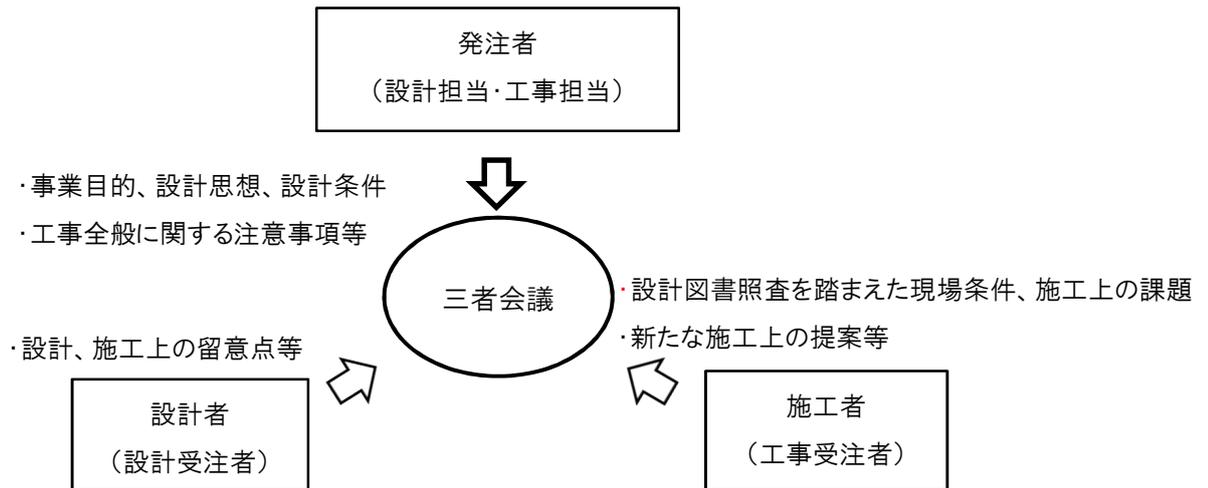

#### ② 対象工事

三者会議は、全工事を対象とする。ただし、三者会議の導入効果が少ないと判断された場合は、施工者と協議し実施有無について決定する。

#### ③ 会議内容

三者会議は下記の内容を標準とし、発注者は事前に課題や質問等の情報を取りまとめ、あらかじめ設計者に回答作成を依頼するなど、会議を円滑に進めるための準備をすること。なお、必要な資料は各者が作成するものとする。

- ・発注者から事業目的、設計思想、設計条件、協議調整条件及び現地条件等の工事全般に関する注意事項等の伝達を行う。
- ・設計者から設計業務の成果品により設計及び施工上の留意点等の伝達を行う。
- ・施工者から設計図書の照査を踏まえた現場条件または設計・施工上の課題、設計照査結果や仮設設計画等に関すること及び新たな施工上の提案等の意見交換を行う。なお、設計図書の照査においては、本ガイドラインの巻末資料Ⅰ「設計図書の照査項目一覧表」を参考にすること。

#### ④ 会議の開催時期

- ・三者会議は、施工者が設計図書を照査した後、原則工事着手前に1回開催するものとする。
- ・追加工事等により改めて設計条件等の確認が必要となった場合にも適宜開催できるものとする。

#### ⑤ 費用の負担

- ・三者会議の開催に係る費用は、発注者が負担する。

## (2)ワンデーレスポンス

### ①ワンデーレスポンス実施の背景

ワンデーレスポンスは、監督職員が個々において実施していた「現場を待たせない」「速やかに回答する」という対応をより組織的、システマ的なものとし、工事現場において発生する諸問題に対し迅速な対応を実現するものである。

### ② 意義と目的

#### ・問題解決の迅速化

公共事業の工事現場において、発注段階では予見不可能であった諸問題が発生した場合、対処に必要な発注者の意思決定に時間を費やす場合があるため、実働工期が短くなり工事等の品質が確保されないケースが発生していると指摘されている。そのため、発注者は「ワンデーレスポンス」の実施により問題解決のための行動の迅速化を図る必要がある。

#### ・適切な工程管理

発注者と受注者間が意志疎通を図り適切に工程管理を行うことにより、実働工期や工事の安全と品質を確保し、余計なコストをかけずに工期内に工事を完成させ、早期に供用開始を行うことでメリットが発生する。

### ③ 実施方法

発注者は、受注者からの協議、軽微な質問等に対する回答は、基本的に「その日のうち」に実施する。ただし、「その日のうち」の回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答日を通知するなど、何らかの回答をその日のうちに行う。

## (3) 設計変更協議会

### ① 目的

設計変更協議会は、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化を目的として、本ガイドラインで判断できない案件に対して、発注者と受注者が一堂に会して、設計変更の妥当性の審査を行う場として開催する。

### ② 対象の工事

設計変更協議会は、全工事を対象とする。

### ③ 審査内容

- ・協議会は、設計変更の妥当性(適・否)について審査を行うものとする。
- ・協議会で必要な技術資料については、各者で作成することとする。また、審査に関わる説明は、協議会を発議した者が行う。
- ・協議会は、説明者に対して過度な説明資料の要求を行わないように努めること。
- ・説明者は、明快かつ簡潔な資料を作成するように努めること。
- ・審査内容について、現地条件の確認が必要な場合は、適宜、現場にて協議会を実施する事が出来る。

#### ④開催時期

- ・協議会は、設計変更の妥当性の判断を行うにあたり、協議会を構成する「発注者」、「受注者」のいずれかの発議により適時開催するものとする。
- ・協議会開催の発議については、事前に発注者と受注者でその是非について協議を行うこと。
- ・協議会は発議者から、施工方法、工事目的物等の変更について協議のあった場合、速やかに開催する。
- ・受注者が協議会の開催を発議する場合、「主任監督員」に要請(協議)するものとする。
- ・協議会の開催協議にあたっては、事前に本ガイドラインを確認すること。

## 11. 新規工種を設計変更により追加する場合の積算比率の取り扱い


すべての契約方式において、当初契約にない工種を新規工種として追加する場合は、積算比率を適用しない。

### (1)背景

当社では一般競争入札及び施工能力確認方式で契約された工事の設計変更において新規工種が追加された場合、受注者の施工体制や材料調達等が異なる場合があるにもかかわらず積算比率を適用していた。

新規工種への積算比率を適用しないことで、より適切な設計変更に資することを目的としている。なお、新規工種は金額を記載しない設計書にて明示されようになっている。

### (2)新規工種を設計変更により追加する場合の契約変更増減基準額の算定方法フローチャート

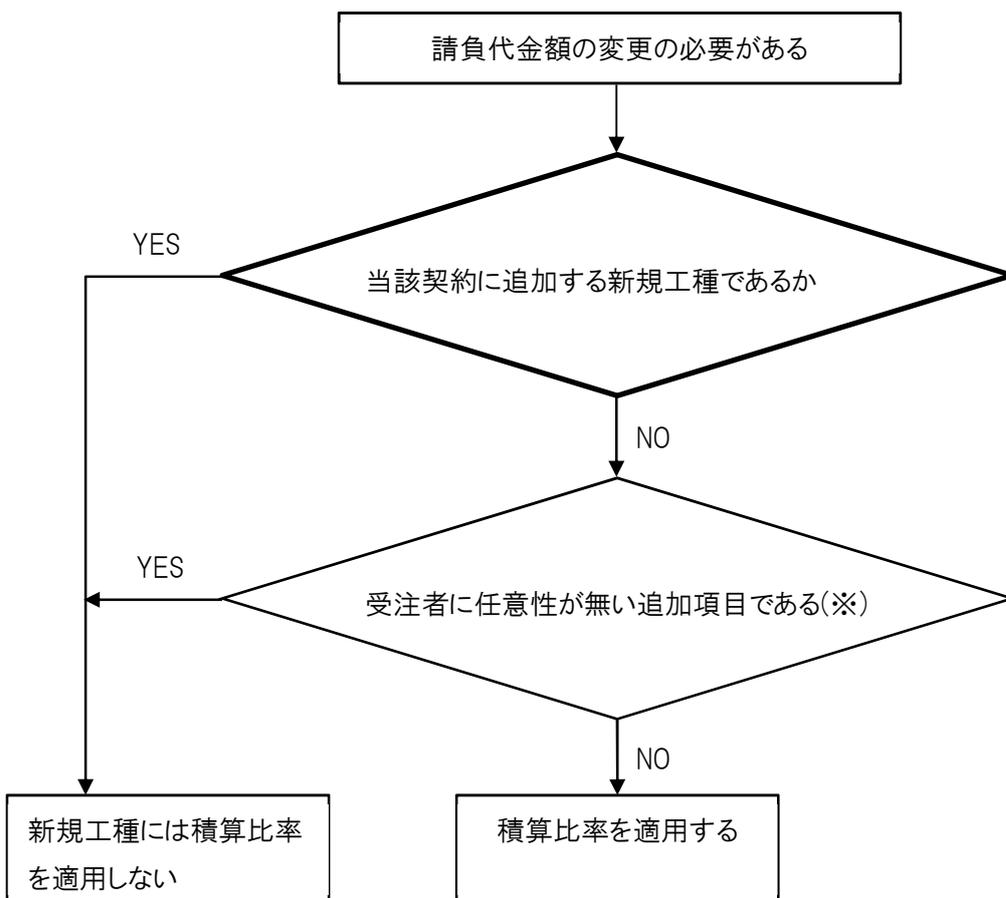

※:「任意性がない」とは、処分先が特定される発生材処理費等、受注者の意思により費用を決定することができないもの

(3)新規工種とは①～④の通りとする。

- ①原則として別途契約すべき性質の工事を当該工事と重要な関連があり、設計変更により処理する方が得策であると認めた事項の変更
- ②契約書第1条にいう設計図書に含まれない事項を新しく追加契約しようとするもの及び工事施工途中において生じた著しい条件変更によるもの
- ③下表、工種の定義(工事設計積算基準〔土木編〕第8節 設計変更の積算より)のうち、「新規工種」に該当するもの

#### 工種の定義

工種	工種の定義
同一工種	構造、工法、断面、材料規格のいずれもが、既契約の積算内容と全く同一な工種をいう。
類似工種	構造、工法、断面、材料規格等の大部分が、既契約の積算内容と同一の工種をいう。
新規工種	上記の同一工種、類似工種が既契約の積算内容になく、新たに追加する工種をいう。

④上記以外に、大幅な条件変更などがあつた場合にも新規工種と同様に取り扱うことができるものとする。

(例)

- ・当初想定した昼間施工から大部分が夜間施工になるなど、施工条件が著しく変わる場合
- ・施工数量が30%程度以上増減する場合
- ・材質や主要機械に変更があり、施工費用が30%程度以上増減する場合 など

(4)契約方式による積算比率の取り扱い(適用する:○、適用しない:×)

従 前				今 後	
契約方式	同一/ 類似工種	新規 工種		同一/ 類似工種	新規 工種
一般競争入札	○	○	➔	○	×
施工能力確認方式	○	○		○	×
競争入札後価格交渉方式 (見積審査タイプ)	○	○		○	×
見積活用方式	—	—		○	×
技術提案価格交渉方式 (複数者交渉 A,B タイプ)	○	×		○	×
技術提案価格交渉方式/ 競争参加要請方式 (簡易提案・見積審査タイプ)	○	×		○	×
技術提案交渉方式	○	×		○	×

## 【巻末資料】

- I 設計図書の照査項目一覧表
- II 当社で施行中の契約方式
- III 設計変更することの妥当性に迷った事例
- IV 工事変更合意書(様式)
- V 参考資料

## I 設計図書の照査項目一覧表

受注者が自らの負担で実施する具体的な照査項目・内容を以下に示す。下記内容は仕様書等に規定されている事項及び工事管理上必要な一般的事項全般を網羅すべく記載したものであり、工事の特色に応じて必要な照査項目等を適切に判断し適用されたい。

なお、照査項目等を追加する場合は、受注者の過度な負担となることのないように留意するものとする。

受注者は、施工前及び施工途中において、下記資料を活用し適切な照査業務に努めるものとする。

設計図書照査項目一覧表

番号	項目	項番	主な内容
1	当該工事の条件明示内容の照査 (1)工事工程	1-1	他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工期等に影響がある場合は、影響箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期等が明示されているか(隣接工事、関連工事)
		1-2	施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法が明示されているか(夜間工事、集中工事、交通規制工事)
		1-3	当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時期が明示されているか
		1-4	関係機関、自治体等との協議結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び影響範囲が明示されているか(河川協議、道路占用協議)
		1-5	余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期が明示されているか(上部工工事、舗装工事、施設工事)
		1-6	工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間が明示されているか(光通信ケーブル、電話線、ガス管、水道管)
	(2)用地関係	1-7	工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期が明示されているか (用地買収、物件の移設、文化財調査)

		1-8	受注者に、桁製作等の工事ヤードとして所有地を使用させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等が明示されているか(工事ヤード提供)
(3) 環境保全対策		1-9	工事に伴う周辺環境保全(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等に制限がある場合は、その内容が明示されているか(仮設工法、架設工法、掘削工事、保全対策など)
		1-10	水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容が明示されているか
		1-11	濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、処理施設や処理条件等が明示されているか(汚濁水処理工、仮設沈殿池)
		1-12	工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に防止するために必要な調査方法、範囲が明示されているか(家屋事前調査、地下水調査)
(4)保安対策		1-13	交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間が明示されているか(交通保安員配置、標識設置)
		1-14	鉄道、電気、ガス、電話、水道等の施設と近接工事で施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容が明示されているか(鉄道、各種埋設管)
		1-15	有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必要な場合は、その内容が明示されているか
(5) 工事用道路		1-16	一般道を搬入路として使用する場合 ① 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等が明示されているか(土運搬、桁運搬) ② 搬入路の使用後及び使用後の処置が必要である場合は、その処置内容が明示されているか
		1-17	仮道路を設置する場合 ① 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その内容、期間が明示されているか ② 仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去)が明示されているか ③ 仮道路の維持及び補修が必要である場合は、その内容が

			明示されているか(迂回路)
		1-18	工事のため、一般道路を占有する場合は、その期間及び範囲が明示されているか(桁架設、取付道路)
		1-19	工事中道路を共同使用する場合の維持、終了後の処置の取扱いが明示されているか
(6) 仮設備関係		1-20	仮土留、仮橋、足場等の仮設物を、他の工事に引渡す場合及び引継いで使用する場合は、その内容、期間及び維持、終了後の処置の取扱いが明示されているか(仮橋、構台)
		1-21	仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その構造及び施工方法が明示されているか(濁水処理工)
		1-22	仮設備の設計条件を明示する場合は、その内容が明示されているか(仮土留、仮橋)
(7) 建設副産物関係		1-23	建設発生土が発生する場合は、残土の受入れ場所及び仮置き場所までの距離、時間等の処分及び保管条件が明示されているか
		1-24	建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合は、その内容が明示されているか
		1-25	建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理方法、処理場所等の処理条件。なお、再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は、その受入れ場所、距離、時間等の条件が明示されているか(コンクリート魂、アスファルトコンクリート魂、基礎くい残土)
(8) 工事支障物件		1-26	地上、地下等の占有物件の有無及び占有物件等で工事支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移設時期、工事方法、防護等が明示されているか(電柱、ガス管、上下水道)
		1-27	地上、地下等に占有物件工事と重複して施工する場合は、その内容が明示されているか(光通信ケーブル)
(9) 薬液注入関係		1-28	薬液注入を行う場合は、施工条件、施工方法、材料種別、施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等が明示されているか
		1-29	周辺環境への調査が必要な場合は、その内容が明示されているか
		1-30	指定された地盤改良の工法が現地の地質にあったものであるか。 また、目的を達成されるものとなっているか。

		1-31	改良材の材料、配合が明示されているか。また、それは適切なものか。
	(10)その他	1-32	土砂処分場を指定する場合は、その場所、有償又は無償の区分、仮設物又は付帯工について施工条件がある場合は、その内容が明示されているか
		1-33	転用土を用いる場合は、時期、場所が明示されているか。また、土質材料として適切なものか。
		1-34	工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、その保管及び仮置き場所、期間、保管方法等が明示されているか(舗装改良工事用機械)
		1-35	工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内での再使用の有無、引渡場所等が明示されているか(交通事故復旧工、防護柵改良工)
		1-36	支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所、引渡時期等が明示されているか(標識車、交通規制器具、凍結防止剤)
		1-37	工事用電力等を指定する場合は、その内容が明示されているか(トンネル工事用電力、深礎工事用電力)
		1-38	架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件が明示されているか
		1-39	土工、法面工事において、現状の地盤高、形状等が明示されているか。また、それらが現地とあっているか。
		1-40	現状の施工基盤高が明示されているか。また、それらが現地とあっているか。
		1-41	工事規制について、範囲、時間、内容等が明示されているか。
		1-39	交通誘導警備員は適切に配置されているか。
		1-40	新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容が明示されているか
		1-41	部分しゅん功、部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時期が明示されているか
		1-42	給水施設を設置する必要がある場合は、取水箇所・方法等が明示されているか
2	関連資料・貸与資料の確認	2-1	ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボイリングが起きない事を検討し確認したか
		2-2	ウェルポイントあるいはディープウェルを行うにあたり、工事着手前に土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確

			認したか
		2-3	浚渫工の施工において、濁水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査・確認したか
		2-4	地質調査報告書は整理されているか・追加ボーリングは必要ないかの確認
		2-5	軟弱地盤の施工に必要な資料はあるかの確認(圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方流動等)
		2-6	測量成果報告書(平面、横断、縦断)は整理されているかの確認
		2-7	共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるかの確認
		2-8	設計計算書等(構造物(指定仮設含む)、隣接工区等、材料計算書、構造計算書、電気通信計算書、設備計算書等)はあるかの確認
		2-9	特記仕様書等に明示してある支障物件移設予定時期及び占用者に関する資料はあるかの確認
		2-10	地盤沈下、振動等による影響が第三者におよばないか、関連資料はあるかの確認
		2-11	地下占用物件である電線、電話線、水道、道路管理者用光ケーブル、その他の地下埋設物を示した図面(平面、横断、深さ等)等関連資料があるか
		2-12	設計成果物等(報告書等)の貸与資料(電子データを含む)に不足がないか、追加事項があるかの確認-
3	現地踏査	3-1	工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事中多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認したか
		3-2	建設発生土の受入地への搬入に先立ち、容量が十分か確認したか
		3-3	周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れがないか確認したか
		3-4	土留・仮締切工の仮設H鋼杭、仮設鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋設物の確認のため、溝掘り等を行い、埋設物を確認したか
		3-5	仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす場合あるいは苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を検討し、確認したか

		3-6	施肥、灌水、薬剤散布の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するものとし、設計図書に示す使用材料の種類、使用量等を確認したか
		3-7	トンネルの施工にあたって、工事着手前に測量を行い、両坑口間の基準点との相互関係を確認したか
		3-8	道路管理台帳及び占有者との現地確認をしたか
		3-9	鋼矢板等、仮設杭の施工に先立ち、明らかに埋設物がないことが確認されている場合を除き、建設工事公衆災害防止対策要綱に従って埋設物の存在の有無を確認したか
		3-10	電線共同溝設置の位置・線形については、事前に地下埋設物及び工事区間の現状について測量及び調査を行い確認したか
		3-11	工事に先立ち、現地を詳細に把握するために現地調査を行い、補強を実施しようとする橋脚および基礎について、形状や鉄筋の位置、添架物や近接する地下構造物等の状況を把握するとともに、海水または鋼材の腐食を促進させる工場排水等の影響や、鋼材の位置する土中部が常時乾湿を繰り返す環境にあるかどうか等を事前に確認したか
		3-12	漏水補修工の施工箇所は、設計図書と現地の漏水箇所とに不整合がないか施工前に確認したか
		3-13	使用する材料や重機の運搬・搬入路を確認したか
		3-14	アンカー工の施工に際しては、工事着手前に法面の安定、地盤の状況、地中障害物、湧水を調査したか
		3-15	周囲の地盤や構造物に変状を与えないように、締切盛土着手前に現状地盤を確認したか
4	設計図	4-1	桁の製作に着手する前に原寸図を作成し、図面の不備や製作上に支障がないかどうかを確認したか
		4-2	施工前に、配筋図、鉄筋組立図、及びかぶり詳細図により組立可能か、また配力鉄筋および組立筋を考慮したかぶりとなっているかを照査したか
		4-3	一般図には必要な項目が記載されているかの確認(水位、設計条件、地質条件、建築限界等)
		4-4	平面図には必要な工事内容が明示されているかの確認(法線、築堤護岸、付属構造物等)
		4-5	構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているかの確認
		4-6	構造図に地質条件(推定支持層、柱状図、地下水位等)を明

			記してあるかの確認
		4-7	図面が明瞭に描かれているかの確認(構造物と寸法線の使い分けがなされているか)
		4-8	構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているかの確認
		4-9	各設計図がお互いに整合されているかの確認 ・一般平面図と縦断図(構造一般図と線形図) ・構造図と配筋図・構造図と仮設図 ・下部工箱抜き図と付属物図(支承配置図、落橋防止図等) ・本体と付属物の取り合い等 ・既存設備及び関連工事との整合等
		4-10	設計計算書の結果が正しく図面に反映されているかの確認(特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか) ・壁厚 ・鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置) ・使用材料 ・その他
		4-11	形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているかの確認
		4-12	地質調査報告書と設計図書の整合(調査箇所と柱状図、地質縦断面図・地質横断面図)はとれているかの確認
		4-13	隣接工区等との整合はとれているかの確認
		4-14	構造物の施工性に問題はないか。設計図等に基づいた適正な施工が可能かの確認(架設条件が設計図に反映されているか) ※橋梁上部工のみ対象
		4-15	工場製品については、品質性能等の規格値が示されているか
5	数量計算	5-1	数量計算は、数量算出要領と整合しているか。また、数量計算に用いた数量は図面の寸法と一致するかの確認
		5-2	数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているかの確認
		5-3	図面による面積計算の縮尺は図面に整合しているかの確認
		5-4	数量計算が金額を記載しない設計書と整合しているかの確認
6	設計計算書	6-1	使用されている設計基準等は適切かの確認
		6-2	設計基本条件は適切かの確認(荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等)※橋梁上部工事のみ対象

		6-3	構造・線形条件は妥当かの確認(橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等)※橋梁上部工事のみ対象
--	--	-----	---

## Ⅱ 当社での工事契約方式（2019年7月現在）

契約方法	契約方式	内容
一般競争	一般競争入札	公募して参加表明書及び技術資料の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった資料により当該競争に係る競争参加資格を確認後、競争入札により落札者を決定するもの
	技術提案価格交渉方式 （複数者交渉Aタイプ）	公募して参加表明書、技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった資料により当該競争に係る競争参加資格を確認し、技術資料及び工事費内訳書を総合的に評価して入札参加者を選定し、次に入札参加者から詳細な技術提案を受け付け、交渉を行った後、競争入札により価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定するもの
	技術提案価格交渉方式 （複数者交渉Bタイプ） 【試行中】	公募して参加表明書、技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった資料により当該競争に係る競争参加資格を確認し、技術資料を評価して入札参加者を選定し、次に入札参加者から詳細な技術提案を受け付け、交渉を行った後、競争入札により価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定するもの
	技術提案価格交渉方式 （簡易提案・見積審査タイプ） 【原則使用不可】	公募して参加表明書、簡易な技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、入札参加希望者から提出のあった資料により当該競争に係る競争参加資格を確認し、簡易な技術資料及び工事費内訳書を総合的に評価して入札参加者を選定し、次に入札参加者の簡易な技術資料及び工事費内訳書について妥当性の確認及び交渉を行い、入札参加者の工事費内訳書を反映した標準価格に基づき予定価格を設定した上で、競争入札により価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定するもの
	技術提案交渉方式 【原則使用不可】	参加表明書及び技術資料の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリング（技術交渉）を実施し、競争参加資格が確認された者のうちから、競争

		入札により、価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定するもの
	施工能力確認方式	参加表明書及び技術資料の提出を受け、競争参加資格が確認されたもののうちから、競争入札により、価格と施工実績等の要素を総合評価して落札者を決定するもの
	見積活用方式(公募型) 【試行中】	公募して参加表明書、技術資料の提出を求め、競争参加資格が確認された者のうちから、見積の提出を受け、ヒアリングを行い、見積の妥当性を確認して予定価格に反映の上、競争入札により、価格と施工実績等の要素を総合評価(加算方式)して落札者を決定するもの
指名競争	指名競争入札	規定により定めた競争参加資格を有する者の中から入札参加者を指名して、競争入札により落札者を決定するもの
	競争参加要請方式 (簡易提案・見積審査タイプ) 【原則使用不可】	有資格業者のうち当該競争に係る競争参加資格の要件を満たす者を対象に競争参加要請を行い、簡易な技術資料及び工事費内訳書の提出を求め、その者から提出のあった簡易な技術資料及び工事費内訳書を総合的に評価して入札参加者を選定し、次に入札参加者の簡易な技術資料及び工事費内訳書について妥当性の確認及び交渉を行い、入札参加者の工事費内訳書を反映した標準価格に基づき予定価格を設定した上で、競争入札により価格と価格以外の要素を総合評価して落札者を決定するもの
	見積活用方式(公募・要請併用型) 【試行中】	公募及び要請して、参加表明者及び要請者から技術資料の提出を受け、競争参加資格が確認された者のうちから、見積の提出を受け、ヒアリングを行い、見積の妥当性を確認して予定価格に反映の上、競争入札により、価格と施工実績等の要素を総合評価(加算方式)して落札者を決定するもの
交渉合意契約	技術提案価格交渉方式 (一者交渉タイプ)	一者に特定した交渉者に工事費算出に係る会社の施工方法、条件等を説明した後、交渉者が提示した価格について技術提案を受けつつ交渉を行い、合意の上、契約の相手方を決定するもの

	価格交渉方式	一者に特定した交渉者に会社が設定した仕様等を説明した後、交渉者が提示した価格について交渉を行い、合意の上、契約の相手方を決定するもの
	単価提示方式 【試行中】	契約の相手方となるべき者に提示単価表を提示し、合意を得て契約の相手方とするもの
	競争入札後価格交渉方式(見積審査タイプ) 【試行中】	入札不調発生後に入札参加者の中から技術資料及び工事費内訳書を総合的に評価した評価値が最高の者を交渉者に選定。交渉者が提示した価格について交渉を行い、合意の上、契約の相手方を決定するもの
随意契約	特命随意契約	一者に特定した見積者から見積書を提出させ、契約の相手方を決定するもの

### Ⅲ 設計変更事例

#### Ⅲ-1 設計変更することの妥当性に迷った事例

下表に示す事例は、当社発注の工事において設計変更の妥当性に迷った事例を収集し、その変更の際の考え方について整理したものである。ただし、各工事においては、事例に示される内容と条件も相違するため、事例に示された内容に類似しているからといって変更して良いということではなく、条件変更に合致していることを確認のうえ、設計変更の判断が必要となる。

##### (1) 共通

番号	適否	変更項目	変更の概要	設計変更の適否の考え方
1	適	仮設	重機等施工機械の移動範囲の地盤強度が足りないことから、当初契約時の設計図書にない敷鉄板等の仮設物が必要となった。	任意による仮設物については、原則として設計変更の対象とはしないが、工事契約後の現地調査等の結果により地盤強度が足りないことが判明したため、工事請負契約書第 18 条第 1 項第四号に該当するものと考えられ、受発注者間の協議により、設計図書の変更を行い、請負代金を変更した。
2	否	仮設	雨水配水管等の地下埋設物の設置にあたり、発注者はオープンカット（任意）によることを見込んでいたが、受注者から土留めとして矢板を設置して掘削したいとの提案があった。	工事の目的は地下埋設物等を設置することであり、その施工方法は任意であることから、この場合の矢板については、任意の仮設物となるため、設計変更の対象としなかった。 ただし、発注者の想定するオープンカットによる施工が現場の諸条件等を踏まえ合理的でないことが判明した場合や当初発注時点で予期しえなかった現場条件等が確認された場合は、受発注者間の協議により設計図書の変更を行い、請負代金額を変更する場合もある。
3	適	仮設	施工条件の変化により、クレーンの仕様等とともに、取付・解体用の補	施工方法は任意であるため、クレーン本体及び取付・解体用の補

			<p>助クレーンにも変更が必要となった。</p>	<p>助クレーンについては原則として設計変更の対象とはしないが、発注者の想定する施工方法が現場の諸条件等を踏まえ合理的ではないことが判明し、当初発注時点で予期しえなかった現場条件等が確認されたため、受発注者間の協議により設計図書の変更を行い、請負代金額を変更した。</p> <p>その際、クレーン及びこれと連携して使用する取付・解体用の補助クレーンは一体で機能するものであることからクレーン本体の仕様等の変更に伴い、取付・解体用の補助クレーンも含めて請負代金を変更した。</p>
4	適	材料規格等	<p>工事契約後、使用材料の入手が不可能(生産中止等)なことが判明し、材料規格等を変更することとなった。</p>	<p>受注者の調査により、工事契約後に設計図書に示された使用材料の入手が不可能であると判明した場合は、工事請負契約書第 18 条第 1 項第二号に該当するものと考えられるため、発注者は使用材料を変更することによる設計上の妥当性の検証及び経済性等の検討を行った上で設計変更の対象とした。</p>
5	否	材料規格等	<p>工事契約後、使用材料の入手に想定以上の時間がかかることが判明したため、材料規格等を変更した。</p>	<p>受注者は、使用材料の入手にかかる時間について工事契約前に想定して工事を受注したと考えられ、工事請負契約書第 18 条第 1 項の条件変更等には該当しないことから設計変更を行わなかった。</p> <p>ただし、発注者の使用材料の選定に明らかに責がある場合及び発注段階では想定されない事象により材料等を変更せざるを得ない場</p>

				合は、設計変更の対象とする場合もある。
6	適	交通誘導警備員	現場説明書に交通誘導警備員Bとの記載があったが、工事契約後、所轄警察署に当該工事での交通誘導警備員の配置について確認したところ、交通誘導警備員Aの配置を求められた。	交通誘導警備員Aは、警備員等の検定等に関する規則第2条(平成17年国家公安委員会規則20号)により都道府県公安委員会が必要と認める場合に配置することが求められている。 交通誘導警備員は、積上げ項目のひとつとして施工条件に明示しており、その変更は工事請負契約書第18条第1項第四号に該当すると考えられ、受注者間の協議により設計変更の対象とした。

(2)技術提案価格交渉方式(複数者交渉タイプ)の設計変更事例

番号	適否	変更項目	変更の概要	設計変更の適否の考え方
1	適	工程短縮に係る費用	<p>・当該工事では、工事用地から検出された PCB 処理に伴う作業中断等による工程遅延を回復するため、当該工事において半年程度の工程短縮が必要となった。</p> <p>・このため、工事工程のクリティカルとなっている鉄道交差部について、当初設計の架設工法・順序を変更し、さらに鋼床版現場接合を溶接接合からボルト接合に変更することによって、工程短縮を図ることが可能となった。</p>	<p>・当該工事は当初想定していなかった工事用地からの PCB 検出により、作業中断が余儀なくされ、工事工程のクリティカルとなっている鉄道交差部の施工方法を見直したものである。</p> <p>・実施された工程短縮策は、目標の工程短縮を達成するために行うものであることから、設計変更により発注者が費用を負担することが適当だと判断した。</p>
2	適	設計費の追加計上	<p>・当該工事において、当初想定していなかった新規工種に伴う図面作成等が必要になったものである。</p> <p>・図面等の作成に当たっては、地元との調整・対応により、何度も図面修正作業が必要となり、このため受注者より作成図面枚数に基づく設計費の計上が求められた。</p>	<p>・当該工事では、設計図等の作成業務は発注者の指示によるものではあることから、設計費の追加計上は妥当と判断した。</p> <p>・但し、設計費の計上方法については、設計図面の作成の実状を考慮すると、図面枚数による変更は妥当でないと判断。</p> <p>・設計費の計上に当たっては、施工工種ごとに設計費の積算基準を準用し行うこととし、同様箇所での軽微な変更図面については、基準に従い同種低減による軽減係数を設け処理を行った。</p>
3	否	桁架設工法の変更	<p>・当該工事の桁架設でのトラス桁降下方法において、当初設計ではサンドルによる降下を想定して積算し、工事契約を行っている。</p> <p>・しかしながら、工事契約後に受注者から、当初設計の降下方法だと、①降下量が標準を超えること</p>	<p>・当該工事の当初設計図書における架設計画の参考図には、降下設備に関する記載はないものの、金抜き設計書においてサンドル降下が計上されており、これによる降下工であることが判断できる。</p> <p>・また、契約時における「質問書」に</p>

			<p>②反力が標準より大きくなること</p> <p>③回転降下を必要とすること</p> <p>などの問題が提起され、受注者により降下工法検討により、降下門構を使用した降下工法に変更し架設を行った。</p> <p>・以上の架設工法の変更について、受注者から設計変更協議として求められたものである。</p>	<p>において、トラス降下設備工に関する質問がなされており、サンドルによる降下工の図面及び仕様等の説明を行っている。</p> <p>・したがって、受注者は架設工法について十分理解し契約したものであり、契約後の条件変更も無かったことから施工承諾として施工は行い、設計変更は行わないこととした。</p>
4	否	場所打杭工での杭頭処理量の変更	<p>・当初設計ではオールケーシング工法による場所打杭工を想定した積算により工事契約を行った。</p> <p>・工事に先立つ地質調査により、地盤が当初想定以上に軟弱であることが分かり、杭細り対策として杭頭余盛りコンクリートを増大した。</p> <p>・これに伴い杭頭処理費用が増大したとして、受注者から杭頭処理に係る歩掛変更について協議が求められた。</p>	<p>・杭頭処理費の積算については国土交通省土木工事積算基準を準用し行っており、同基準において杭頭処理費用の歩掛は1本当りであることや、杭頭処理量は契約書類上の記載事項でないため、杭頭処理量の変更は設計変更に当たらないとの判断を行った。</p>
5	適	地質調査結果による基礎杭工の変更	<p>・当初設計では工事周辺で実施された既存のボーリングデータをもとに支持層を推測し、設計を行っていた。</p> <p>・これに対し工事契約時に受注者からの「技術提案」として、追加ボーリング調査が提案された。</p> <p>・これに基づき追加ボーリング調査を実施し、その結果から支持層に変更が生じ、基礎工事の設計見直しにより、場所打ち杭が追加となった</p>	<p>・追加ボーリングは「技術提案」であることから設計変更の対象とはならないが、この調査により変更が必要となった場所打ち杭の追加工事については、条件変更と判断し、設計変更の対象とした。</p> <p>・なお、場所打ち杭の追加工事費については、当初設計にもあることから、類似工事として受注率を考慮した変更をおこなった。</p>

6	適	関係機関協議による基礎施工法の変更	<p>・当該工事のケーソン基礎は、当初設計では通常の沈下掘削を想定して工事費の積算を行ったが、その後、関係機関等との協議により、振動に対する周辺環境への配慮が求められた。</p> <p>・このため、振動を抑えるためにケーソン基礎を通常施工方法から圧入工法を併用するよう変更することとした。</p>	<p>・当初設計図書の特記仕様書に、「現場条件または関係機関との協議により条件が変更となった場合は、設計変更の対象とする」との記載がある。</p> <p>・工法の変更は、関係機関との協議により、周辺環境対策として行うものであり、受注者の責に抛らないことから、設計変更が妥当と判断した。</p>
7	適	関係機関協議による仮設工法の変更	<p>・当該工事の締切鋼矢板の引抜きは、当初設計では油圧圧入引抜き機による引抜きを想定して工事費の積算を行ったが、関係機関等との協議において、周辺への影響を極力小さくするよう要請があった。</p> <p>・このことから、受注者から鋼矢板引抜き時の補助工法としての同時注入併用工法の提案を受け、受注者との協議の結果、これに基づく工事の変更指示を行った。</p>	<p>・当初設計図書の特記仕様書に、「現場条件または関係機関との協議により条件が変更となった場合は、設計変更の対象とする」との記載がある。</p> <p>・工法の変更は、関係機関との協議により、周辺環境対策として行うものであり、受注者の責に抛らないことから、設計変更が妥当と判断した。</p>
8	否	軟弱地盤による基礎工法の変更	<p>・当初設計では、ケーソン基礎工事の沈設に伴う軟弱地盤対策は無く、工事契約後に、受注者から軟弱地盤でのケーソン沈下時の傾斜が懸念され、補助工法としてのケーソン室内のサンドル組立の追加変更の協議が出された。</p> <p>・なお、追加実施されたボーリング調査結果では、当初条件の土質と大きな違いは無かった。</p>	<p>・当初設計図書では土質条件が図面により明記されている。</p> <p>・受注者は、ケーソン基礎の傾斜を予め予想できたものと考え、基本条件に変更はないことから、設計変更は行わないと判断した。</p> <p>・なお、追加の補助工法については、施工承諾として処理した。</p>

9	否	沈設を考慮した基礎施工方法の変更	<p>・当初設計では、土質条件による沈下関係図から、ケーソン刃口のフリクションカット厚を 22mm として積算し工事契約をおこなった。</p> <p>・工事契約後、受注者より沈設不能回避のため上記のフリクションカット厚を 41mm に変更したいとの協議があった。</p> <p>・なお、当初契約におけるフリクションカット厚は任意仮設扱いとしており、追加ボーリング調査での土質調査結果は当初設計のものと大きな変更はなく、杭長変更もなかった。</p>	<p>・当初設計から土質条件や杭長の変更がないことから、設計変更に該当しないとした。</p> <p>・但し、受注者からの沈設不能の恐れがあるとの要請を受け、施工承諾として受注者提案による施工を実施した。</p>
10	否	品質向上となる RC 床版はつり工法	<p>・橋梁拡幅工事において、既設床板部と新設床版との接続部は、既設床版切断後に鉄筋を 10cm 程度はつり出し、新設部の鉄筋と突き合わせアーク溶接で接合する工法としていた。</p> <p>・当初設計では、この鉄筋はつり出しこれを手はつりによるによる積算で工事契約をしていたが、受注者から当初設計による方法だとマイクロクラック問題があるとして、ウォータージェット工法によるはつりに変更するべきとの協議があった。</p>	<p>・当初設計での手はつりによる方法が品質上問題となると考えられなかったため、設計変更しないこととした。</p> <p>・但し、受注者の提案したウォータージェット工法によるはつりは、品質向上に資する創意工夫案件扱いであるとして、施工承諾により施工することとした。</p>
11	適	床版補修工	<p>・当該工事は RC 床版張出部のコンクリート剥落防止工を行うものであったが、現場調査を実施したところ、当初設計で想定されたものより、非常に多くの損傷が確認された。</p> <p>・当初設計は、断面修復材による整形を行う小規模の断面修復工が計上されていたが、実際は床版状況を確認しながら脆弱部を取除き断面修復を行っていく必要があり、</p>	<p>・当初設計では基準に基づく断面修復工により積算を行っていたが、今回の施工条件と合わないことから、実態に合わせて設計変更するのが妥当と判断した。</p>

			<p>施工実態は異なる方法により行うこととなった。</p> <p>・これについて、受注者から施工実態を調査のうえ、その結果に基づく見積もりによる変更が求められた。</p>	
12	適	<p>現地調査や関係機関協議による桁連結工法の変更</p>	<p>・橋梁拡張工事での PC ケーブルによる主桁連結において、当初設計では既存桁のケーブル用穿孔をコア穿孔により施工することとしていた。</p> <p>・現場調査(鉄筋探査)した結果、図面と異なる位置に鉄筋や PC 鋼材が入っていることや、横桁のコンクリート被りが鉄筋探査能力を超える厚さがあり、すべての鉄筋が探査できないことが分かった。</p> <p>・これについて、当初設計の方法によると構造上問題となる鉄筋を切断する危険性があることから、工法検討の結果、ウォータージェットによる穿孔に変更することとした。</p> <p>・また、当初設計の施工ではベント設置を想定していたが、道路管理者協議により設置が出来なくなり、施工方法を検討した結果、それに代わるものとして、一部ケーブルの先行緊張による主桁の仮連結と段階施工による方法に変更することとした。</p>	<p>・当初設計では特記仕様書に「実施設計の結果、追加の補修等が必要となった場合は設計変更協議の対象とする」との記載があった。</p> <p>・これに基づき、現場調査結果による所定の品質確保のための穿孔方法の変更や、関係機関協議による安全確保のための施工方法の変更は、受注者の責に抛らないと考えられることから、設計変更により処理することが妥当と判断した。</p>
13	適	<p>床版剥落防止工法の変更</p>	<p>・当該工事は、吊足場の設置に伴う構造物点検を実施したところ、床版ハンチ部に多数の損傷が確認され、剥落防止工により補修を行うものである。</p> <p>・当該箇所では、既に床版補強工事がなされており、床版ハンチ部の</p>	<p>・当初設計は、当社積算基準により一般的な剥落防止工として積算を行っていたが、現地状況がこれによることが出来ない施工条件であるため、実態調査を行い、それに基づき設計変更を行うことが妥当と判断した。</p>

			<p>剥落防止は床版補強後の施工となるため、当初設計で想定していたグラインダーによるコンクリートの素地調整出来ず、サンドペーパー等による手作業となった。</p> <p>・このため、受注者から実態に合わせた施工能率による変更の協議があったものである。</p>	
14	適	計測工の追加	<p>・当該工事箇所は重交通街路が直近であることや隣接地に商業ビルや地下駐車場があることから、周辺地盤への影響を監視する必要性が生じた。</p> <p>・このため、基礎工事の仮締切の施工に当たって、当初設計では無かった仮設材への計測機器（傾斜計、ひずみ計等）を設置し、常時変位等を観測できるよう追加変更した。</p>	<p>・当初設計の特記仕様書では計測工に関する記載は無かった。</p> <p>・当該箇所の状況から周辺地盤への影響を常時観測する必要があると発注者が判断したものであることから、それに係る計測器の設置や常時観測の費用は、設計変更により処理するのが妥当と判断した。</p> <p>・なお、今回の計測工の追加は、当初契約の工種に無いことから、請負率を考慮しない変更とした。</p>
15	適	現場条件による仮設工の変更	<p>・当該工事では、橋脚補強工事を行うにあたって、当初設計ではオープン掘削による方法としていた。</p> <p>・これが工事施工時の掘削において地下水が出たため、受注者より鋼矢板による締切による変更の協議があった。</p> <p>・なお、当初設計図書には地下水位を明示する資料がなかった。</p>	<p>・当初設計の特記仕様書には「仮設工法に変更があった場合は設計変更協議の対象とする」ことが明記されていた。</p> <p>・当初設計では地下水位に関する資料がなく、本件については現場条件の変更があったと判断されることから、設計変更による処理を行なった。</p>
16	適	関係機関協議による仮設工の変更	<p>・当該工事では、橋脚補強工事を行うにあたって、当初設計ではオープン掘削による方法としていた。</p> <p>・そのうち一部の箇所について、関係機関協議により工事借地面積の縮小が求められ、ライナープレートを用いた掘削方法に変更を行なった</p>	<p>・関係機関との協議による変更であることから、設計変更が妥当と判断した。</p>

17	適	発注者理由による工期の変更に係る費用	・新設路線のトンネル換気設備工事において、ランプ部の工程がトンネル工事の大幅な遅延により、ジェットファン等の換気設備の工期内の施工が困難となった。そこで、受注者に対して必要な工期延伸を求めた。	・当該工事では、部分的に施工を継続できることから工事一時中止とはせずに、発注者の理由による工期の変更とし、工期延伸に伴い必要と認められる現場管理費等について、発注者が負担することが適当だと判断した。
----	---	--------------------	--	---

(3)技術提案価格交渉方式(一者交渉タイプ)の設計変更事例

番号	適否	変更項目	変更の概要	設計変更の適否の考え方
1	適	基礎杭工	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当初設計では鋼管杭は中堀圧入工法、場所打ち杭はオールケーシング工法を想定して工事契約を行っている。</li> <li>・当該工事箇所は交差点部であり施工ヤードが狭いことから、関係機関との協議により、施工方法の変更や施工時間の短縮が求められた。</li> <li>・工法検討の結果、施工方法をロータリーボーリング工法に変更することとした。</li> </ul>	・当該工事の施工方法の変更は、関係機関協議による結果であることから、受注者の責によらないため設計変更により処理することとした。

(4)技術提案価格交渉方式(複数者交渉タイプ)高度提案型の設計変更事例

番号	適否	変更項目	変更の概要	設計変更の適否の考え方
1	否	セグメント製作工の変更	<p>・当該工事のシールドセグメントにおいて、当初設計からのシールド線形、土質条件の変更に伴う実施設計の結果、鋼殻セグメント構造が変更し、受注者から設計変更協議がだされた。</p> <p>・当初設計書でのセグメント単価はメーカー見積り単価が採用されており、受注者から提示された構造変更後のセグメント単価は当初設計単価に対し高額となっていた。</p> <p>・受注者に対して、セグメント単価の増額根拠を求めるものの、明確な内訳が受注者から提示されなかった。</p>	<p>・セグメント単価の増額内訳の提示がなければ、当初設計に対する変更後の単価の妥当性が判断できないため、設計変更しないこととした。</p>
2	適	耐震設計による躯体構造変更	<p>・当該工事では、当初設計で行われていない耐震設計を実施したことにより、非開削トンネル切開き部において構造変更が生じたものである。</p> <p>・対象箇所はN値50以上の安定した基盤層にあり、当初設計の技術提案では耐震設計を考慮しなくても「地震時においても安全な構造」と考えていた。</p> <p>・これに対し、工事契約後の実施設計において、当該箇所は大断面の非開削開削による拡幅という特殊構造であることから、安定した基盤内であっても耐震設計を行い安全性の確認を行う必要があるとして、これに基づく構造変更</p>	<p>・当初設計での特記仕様書では「実施設計成果の数量変更に基づき設計変更を行う。ただし、技術提案内容の変更は設計変更の対象としない」と記載していた。</p> <p>・更に当初設計図書の設計条件には「地震時においても安全な構造とすること」との記載していた。</p> <p>・したがって、今回の構造変更は地震時における安全な構造となるべく行われた耐震設計によるものであり、当社からの追加指示であるため設計変更を行う。</p>

			を行うこととした。	
3	否	シールド(防水シール)施工場所の変更	<p>・当初設計の受注者からの技術提案では、シールドセグメントの防水シール貼付けを、工事作業帯内に設けられた防音ハウス内で行うこととしていた。</p> <p>・しかし、地元対応により当初計画の防音ハウスが縮小し、防音ハウス内でのシール貼付が出来なくなり、他の場所を借地してシール貼付けと、そのためのセグメント仮置きスペースを確保することとなった。</p> <p>・この借地代は地元対応による防音ハウス縮小が原因で発生したことであるとして、受注者から設計変更の協議がなされたものである。</p>	<p>・受注者は当初設計から防音ハウス内での防水シール貼付け及びそのためのセグメント仮置きを想定していたと主張した。</p> <p>・しかしながら、以下の理由から本件について設計変更は妥当でないと判断した。</p> <p>①技術提案書では防音ハウス内でシール貼付けを行うことが明記されておらず、受注者の主張が確認できないこと。</p> <p>②本工事は高度技術提案型の契約であることから、シール貼付け場所は技術提案時から受注者が想定していなくてはならないと考えること。</p>
4	適	工程短縮のためのシールド設備追加	<p>・当初設計の受注者からの技術提案では、工費削減のため1台のシールド機を転用し、4本のトンネル掘削を行うこととして工事契約した。</p> <p>・しかしながら、埋蔵文化財調査等による工事着手が遅れ、工程短縮を行う必要が生じた。</p> <p>・これについて工法検討を行った結果、シールド機を2台製作し、複数のシールドを同時掘進することにより、設備転用による解体・設置手間の省略や、シールド掘進の工程短縮を図ることとした。</p>	<p>・当初設計では、工費削減のため1台のシールド設備を転用する計画となっていたが、特記仕様書に「工事着手が遅れた場合等において、設計変更協議を行うこととする」と記載されていた。</p> <p>・今回のシールド設備の追加変更は、工程短縮のために行う必要のものであり、受注者の責に拠らないことから、設計変更により処理することが妥当であると判断した。</p>
5	適	連続壁の逸泥防止対策	<p>・当初設計の受注者からの技術提案では、換気所工事の山留めを泥水固化壁工法による施工とし</p>	<p>・当初設計の特記仕様書には、「基本条件図書と一致しない場合は設計変更協議の対象とする」、</p>

			<p>て工事契約を行ったが、山留め施工時に泥水が地上に流出する事象が発生し、周辺地元への影響に配慮する必要が生じた。</p> <p>・原因調査の結果、施工地盤中の亀裂から逸泥していることが判明し、地盤の亀裂を塞ぐために地盤改良の追加変更を行った。</p>	<p>「施工に関して疑義が生じた場合は主任監督員と協議する」と記載されている。</p> <p>・基本条件図書では、土質の一部に亀裂の存在が明記されておらず、これが原因で山留め施工時の泥水流出事象が発生したものであるため、この逸泥防止対策としての地盤改良は受注者の責に拠らないことから、設計変更により処理することが妥当であると判断した。</p>
--	--	--	---	---

(5)一般競争入札(入札後技術審査タイプ)の設計変更事例

番号	適否	変更項目	変更の概要	設計変更の適否の考え方
1	否	安全を考慮した工事規制の変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高速上の舗装工事を行うための工事規制をについて、当初設計ではVA規制として工事契約を行っていたが、工事契約後に受注者から、工事の安全性等を考慮しWA規制にて施工したいとの変更協議があった。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当初設計において、設計書及び特記仕様書にVA規制にて行うことが記載されていた。</li> <li>・工事契約後の現場条件等に変更がないことから、設計変更の対象としなかった。</li> </ul>
2	適	薄層舗装工の変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該工事はカーブ箇所の安全対策として、視認性向上のための薄層舗装を施工するものである。</li> <li>・当初設計での薄層舗装は、舗装補修後に1週間程度の時間を空けて施工する必要があるうえに一時的に黒舗装色となる問題がある。</li> <li>・これに対して、試験施工として当社が指示したカラーポーラスアスコン舗装は、舗装打換えと視認性向上が同時に可能となり、全体の工程短縮が実現するメリットもあることから、これによる舗装打換えに変更した。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今回の薄層舗装の工法変更は、当社からの指示事項であることから、設計変更により処理することは妥当と判断した。</li> </ul>
3	適	工程延伸に伴う足場損料	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該工事は床版補強工事であり、当初の契約期間は1年程度であり、これに基づき足場損料を算定していた。</li> <li>・ところが、床版補強工事の事前に行った足場内点検結果により、関連工事である桁補修・塗装等の工程延伸が発生し、当該工事の足場設置期間が大幅に延伸することとなった。</li> <li>・これに対し、受注者へ確認したところ、足場延伸期間においても、受注者は当初単価でリース会社に足場損料を支払う必要があり、受注者から当初の足場単価に基づく変更を求められたものである。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本件は、受注者の責に依らない理由のため足場設置期間が当初設計から大きく変更されたものである。</li> <li>・足場損料は、設置期間が長くなると単価は安くなるが、足場の設置時点での単価がリース会社と受注者との契約に制約を受ける事例である。</li> <li>・今回の工期延伸は受注者の責によらないため、工程延伸分の足場損料についても当初設計の単価により変更処理することが適切であると判断した。</li> </ul>

(6) 施工能力確認方式(試行中)の設計変更事例

番号	適否	変更項目	変更の概要	設計変更の適否の考え方
1	適	鋼殻研掃工	<p>・シールドトンネルにおける鋼殻セグメントの現場塗装工事を行うにあたり、当初設計ではウォータージェットによる錆研掃を行うこととしていた。</p> <p>・工事契約後の現場調査の結果、想定を超える浮錆があり、これを撤去しなければウォータージェットによる鋼殻研掃ができないことが判明し、グラインダー等による浮錆撤去工を追加することとした。</p>	<p>・現場調査の結果、当初設計で想定していなかった現場条件の変更による施工方法の追加変更であるため、設計変更による処理を行うこととした。</p>

(7) 技術提案価格交渉方式(簡易提案・見積審査タイプ)の設計変更事例

番号	適否	変更項目	変更の概要	設計変更の適否の考え方
1	適	工事一時中止に伴う増加費用	<p>・新設路線における料金所ETC設備工事において、6箇所料金所のうち1箇所が土木及び料金所建築工事の大幅な工程遅延により、工期内の施工が困難となった。そのため発注者から大幅な工期延伸を求められた。</p>	<p>・当該工事は、今回対象の料金所以外はしゅん功済であり、また対象料金所の施工開始まで期間もあったため、契約書第20条に基づき工事一時中止を通知し、必要と認められる共通仮設費等について、発注者が負担することが適当だと判断した。</p>
2	適	関係機関協議による作業時間の変更	<p>・新設路線における料金所建築工事において、鉄道と近接していることから鉄道事業者と協議を行ったところ、作業時間を昼間作業より夜間作業に変更するよう依頼された。</p>	<p>・作業時間の変更は、鉄道事業者との協議により、列車の安全対策として行うものであり、受注者の責に抛らないことから、設計変更が妥当と判断した。</p>
3	適	関係機関協議による山留工法の変更	<p>・管理施設の建築工事において、土工事山留工法を指定仮設で当初は経済性を考慮して親坑・横矢板工法で計画していたが、鉄道と近接して</p>	<p>工法の変更は、関係機関との協議により、鉄道施設への影響低減対策として行うものであり、受注者の責に抛らないこと</p>

			<p>いることから施工協議を行ったところ、振動や崩壊に対する配慮が求められ、オーガー併用セメントミルク工法に変更することとした。</p>	<p>から、設計変更が妥当と判断した。</p>
4	適	<p>工程短縮に係る費用</p>	<p>・新設路線の換気所建築工事において、供用に向けて関連工事と換気塔廻りのヤード工程の調整をしたところ、2か月程度の工程短縮が必要となり、換気塔工事の作業時間を昼間作業から昼夜間作業に変更し、また、換気塔頂部の笠木施工を現場打ち工法からプレキャスト工法に変更することにより工程短縮を図ることが可能となった。</p>	<p>・当該工事は供用に向けて、工事工程のクリティカルとなっている換気塔廻りのヤードを早期に土木工事へ引き継ぐために施工方法を見直したものであり、実施された工程短縮策は、目標の工程短縮を達成するために行うものであることから、設計変更により発注者が費用を負担することが適当だと判断した。</p>

### Ⅲ－2 設計変更事例

前項は設計変更の妥当性に迷った事例を収集し、その変更に際しての考え方について整理したものであるが、本項では設計変更の事例を受発注者双方に調査し、その変更設計の実施にあたっての判断理由及び協議内容等について取りまとめた。前項と同様、事例に示された協議内容等に類似しているからといって変更して良いということではなく、条件変更に合致していることを確認のうえ、設計変更の判断が必要となる。

(1) 発注者事例

番号	実施	変更項目 【】は工事種別	変更内容	実施の判断理由	協議内容等
1	適	【開削トンネル】 トンネル工 仮設工	重交通の都道直下における開削トンネル躯体の構築に関して、時間的制約、作業ヤードの制約等から懸念される構造物の品質確保と施工性確認を目的とした試験施工を追加	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 構造物の品質確保と施工性確認を目的とした試験施工を行うこと。試験施工に係る費用については設計変更協議の対象とする。	当初契約時に試験施工の実施は決まっていたが、試験項目が見込まれていなかったため、必要な試験項目や費用について受発注者間で綿密に協議を重ね、試験項目を決定した。
2	適	【橋梁鋼上部】 舗装工	発注を予定していた舗装工事が不調で契約がされなくなったため、上部工事に舗装工を追加	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 実施設計及び現地調査の結果、数量に変更が生じた場合は設計変更協議の対象とする。	受注者が想定していた工種ではないため、主に費用についての協議に時間を要した。
3	適	【橋梁下部】 地盤改良工	埋立地の施工ヤードにおける工事用道路造成において、ボーリング調査の結果必要な地耐力がないことが判明したため、地盤改良工を追加	基本条件図書にボーリングデータは記載されていたが、工事用道路造成に必要な表層部の記載がなかったため、費用計上が妥当と判断。	特記仕様書に記載されているリスク分担保では「不可視土質への対応は受注者負担」としていたが、一方で「現地調査の結果により必要があると認められた場合は契約変更を行う」としていた。当初提示していない部分についての必要性を受発注者間で協議し契約変更を行った。

4	適	【塗装補修】 塗替塗装工	現地調査の結果、既設塗装の状態が悪いことが判明、素地調整工を3種から1種に変更 また、変更に伴い作業日数が増加となり、吊足場の損料期間を変更	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 現地調査の結果、数量に変更が生じた場合には主任監督員と協議し、設計変更協議の対象とする。	塗装の作業能率について受発注者間で相違があったため、施工実態を調査し、受発注者間で協議を重ね、吊足場の損料期間を設定した。
---	---	-----------------	---	---	---

(2) 受注者事例

番号	実施	変更項目 【】は工事種別	変更内容	実施の判断理由	協議内容等
1	適	【非開削トンネル】 土砂処理費	泥土処理費について、協議により指定地処分に変更 指定地処分に伴う受け入れ基準を満たすための改質工を追加	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 現地条件や数量等の変更があった場合には、設計変更協議の対象とする。	改質を作業するヤードが確保できなかったため、現場施工ヤード内で改質を行える改質材や添加方法等を比較検討・提案し、効果的であると認められた。
2	否	【開削トンネル】 鉄筋工	工期短縮を目的として、鉄筋工における継手方法を、ガス圧接継手から機械式継手に変更 また、せん断補強鉄筋の定着方法をフック形状から機械式定着(Tヘッド工法)に変更	設計変更協議を行ったが、本工法を採用することによる具体的な短縮効果が不明であるため、契約変更は行わないと判断。	受発注者ともに工程の遅延は認識していたが、工程短縮を目的とした変更理由の整理が整わず、協議を断念してしまった。しかし、工程短縮が必要であったことは明らかであったため、もう少し早く理由の整理を行い交渉すれば良かった。

3	適	【開削トンネル】 鉄筋工	工期短縮を目的として、鉄筋工における継手方法を、ガス圧接継手から機械式継手に変更 また、重交通の都道直下における工事のため、鉄筋を投入する開口部が狭小となってしまうため、継手箇所、及び覆工下の小運搬工を追加	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 関係機関との協議により、施工区間・仮設構造・躯体構造を変更することがある。その場合は設計変更協議の対象とする。	当工事は首都高速道路(株)が受託した工事であるため、委託元の事業主体を想定した説明資料を作成し、工期短縮の必要性や覆工下作業について密に協議を進め、妥当であるとの判断がされた。
4	一部 適	【橋梁下部】 場所打ち杭工	埋戻しについて、他工種から発生した土砂を仮置ヤードに仮置き流用することとしていたが、仮置ヤードの用地取得に遅れが生じた。また、現場施工ヤード内に仮置きスペースを確保すると工程遅延が生じるため、埋戻し材を流動化処理土に変更	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、工程遅延が明確な箇所のみ、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 現地条件や数量等の変更があった場合には、設計変更協議の対象とする。	4 橋脚について現場施工ヤード内に仮置きスペースが確保できないため、その理由について受発注者間で協議を行ったが、工程遅延理由(用地取得の遅れ)が明確な 1 橋脚のみ妥当であると判断され、他 3 橋脚については明確な説明ができなかった。
5	一部 適	【床版補強】 断面補修工	現地調査の結果、床版コンクリートの状態が非常に悪いことが判明、補強工事前にコンクリート床版の断面補修を追加	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 追加工種が必要となった場合は、設計変更協議の対象とする。	当初契約では想定されていないため新規工種として追加を行った。しかし、重交通の国道上での作業のため、昇降設備が必要最小限に抑えられ作業能率が標準よりも低くなったが、受発注者間での協議で施工能率の低下については認められなかった。 作業時間のサイクルタイムを整理し説明するなど、発注者への説明を行えば良かった。

6	適	【橋梁下部】 土砂処理費	現地調査の結果、土壌の汚染が確認されたため、汚染土壌の処理工や保管等について追加	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 現地条件や数量等の変更があった場合には、設計変更協議の対象とする。	汚染土壌に関する関係法令を調査し理解をした上で、コンプライアンスを重視した対応方法について発注者と協議を行った。
7	適	【トンネル補強】 Con 剥落防止工 排水施設改良工 止水工等	現地調査の結果に伴う数量変更、コンクリート剥落防止工の工法変更、止水工の追加等	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 追加工種が必要となった場合は、設計変更協議の対象とする。	設計変更協議について、発注者側は工事担当者だけでなく設計担当者も出席して、妥当性について議論を行った。 また、現場状況を逐一報告することで、発注者の理解を得られるように努めた。
8	適	【改良工事】 上部拡幅工	当初、新設桁架設後に足場解体を行い、街路を規制しながら既設床版を撤去する計画であったが、工程短縮を目的とし、床版拡幅用に足場を残置したまま既設床版を撤去する工法に変更	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 本工事は早期完成が求められる工事であり、……工期短縮を検討すること。 本工事は高速道路及び街路の重交通下の工事であり、施工に際しては交通影響を極力低減する必要があるため…交通規制回数の削減及び規制時間の短縮を検討すること。	早期完成を実現するため、数々の工種の工程短縮が求められているため、工期短縮を行わなければならない工種として既設床版撤去工の工法変更を検討した。 工期短縮だけでなく、高速道路及び街路の交通影響を少なくする事も念頭に入れて工法選定を行い、発注者との協議に努めた。

9	一部 適	【改良工事】 仮設備工	常設作業帯設置範囲における 2 交差点について、当初は 2 交差点の同時閉鎖を考えていたが、交通管理者との協議において、1 交差点は必ず解放しておくこととなったため、工事進捗に合わせた常設作業帯形状の変更	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 交通管理者及び関係機関等との協議結果により、規制形態、規制時間や交通誘導員の配置に変更が生じた場合には、設計変更協議の対象とする。	常設作業帯の形状変更に伴う仮舗装や仮設ガードレール設置の増加について設計変更協議の結果妥当と判断されたが、発注者の積算基準により標準的な積算で計上された。しかし、標準的な施工能率では実態と乖離しているため、施工箇所の特性に留意した協議を実施し、発注者の理解を得られるようにすれば良かった。
10	適	【橋梁鋼上部】 鋼桁架設工	工程短縮を目的として鋼桁架設における架設工法を、100t クローラークレーンを使用した地組架設から、120t オールテレーンクレーンを使用したベント架設に変更	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 現場調査、関係機関との協議等により提示した条件が変更となる場合は設計変更を行い、必要があると認められる場合は契約変更の対象とする。	関係機関協議の遅延による工事用進入路設置の遅れにより工事完成が遅延する可能性があった。そのため、当初と変更の工程表、施工ステップ図を作成・比較することにより、架設工法を変更することで他の工種が同時施工可能であり、その結果工程確保に有効であると説明ができた。しかし、協議資料の作成にかなりの労力や時間を要したため、事前に受発注者間で必要な資料の調整を行うべきであった。

11	否	【排水施設】 排水管敷設工	高速出口路下の排水管敷設工において、塩ビ推進工法により施工を行っていたが、施工途中で障害物があることが判明し、障害物の調査・撤去が可能な鋼管推進工法に変更	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、受注者の調整不備が原因として、費用計上は妥当ではないと判断。  (特記記載内容) 現地条件や数量等の変更があった場合には、設計変更協議の対象とする。	当該工事の施工前に、高速出口では通行止めが行われていたが、その際に並行して施工が可能であった箇所であるため、受注者側の調整不足とされた。当該箇所に障害物の存在を予測しておらず、他地区で行っている推進工事と合わせて施工をすることによる経済性を優先した計画としたことが間違いであった。
12	適	【塗装補修】 塗替塗装工	当初、素地調整については全面ブラスト処理で行うこととされていたが、近隣住民への騒音影響が懸念されたため、手動工具による素地調整に変更 また、「鋼橋塗装塗替え工事火災安全標準」を適用することとなり、溶剤系塗料から水溶性、無機系塗料に変更	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 関係機関との協議、地元調整、……の結果により数量等に変更が生じた場合は、設計変更にて処理する。	近隣住民への騒音影響の他、「鋼橋塗装塗替え工事火災安全標準」を適用することになったため、素地調整の他、塗替工の歩掛について、各工程の作業内容、所要時間について標準作業と、当現場の条件を反映した比較検討資料を作成、作業内容が確認できる各工程の状況写真を添付し、発注者と協議を行った。
13	適	【橋梁鋼上部】 鋼桁架設工	工期短縮を目的として鋼桁架設における架設工法をベント架設から、一括架設工法に変更	契約書類(特記仕様書)に記載の通り受発注者間で設計変更協議を実施し、費用計上が妥当と判断。  (特記記載内容) 現地条件や数量等の変更があった場合には、設計変更協議の対象とする。	工事完成が遅れると、他機関事業に影響があるため一括架設工法に変更を行った。しかし、ベント工法を想定した桁製作まで完了していたため、一括架設を行うための手直しが必要となったが、架設方法等を綿密に検討することにより部分的な修正にとどめ、費用の増加を最小限に止めた。

## 工事変更合意書

工事名 \_\_\_\_\_

〔施工依頼及び契約変更の実施〕

標記の請負工事契約は、本変更工事合意書を以て、以下の通り変更されるものとします。

なお、本件に関しては別途変更契約書を締結します。

変更契約書の締結予定時期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_

〔工事変更内容〕

1. 工事変更概要

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

※ 工事変更数量等については、別紙参照

2. 工事変更概算金額

(増額・減額) ¥ \_\_\_\_\_ (税抜)

上記工事変更による工期の変更

有 ( \_\_\_\_\_ 日 延期) ・ 無

本工事変更合意書を以て、上記変更内容については、発注者・受注者ともに確認した。

(発注者) 首都高速道株式会社

○○局長 □□ □□ 印

(受注者) ○○○株式会社

現場代理人 △△ △△ 印

収 入 印 紙 (受注者)	収 入 印 紙 (発注者)
---------------------	---------------------

## V 参考資料

### ■工事請負契約書

#### 第1条(総則)

1. 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並びに金額を記載しない設計書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2. 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3. 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任と費用において定める。
4. 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5. この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6. この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7. この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8. この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9. この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10. この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11. この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12. 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対してこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

#### 第18条(条件変更等)

1. 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
  - 一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並びに金額を記載しない設計書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
  - 二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
  - 三 設計図書の表示が明確でないこと。
  - 四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
  - 五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2. 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3. 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間中に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4. 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
  - 一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う
  - 二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う
  - 三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5. 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

#### 第19条(設計図書の変更)

発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

#### 第20条(工事中止)

1. 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、破壊行為その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であつて、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2. 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3. 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

#### 第21条(受注者の請求による工期の延長)

1. 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2. 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

#### 第22条(発注者の請求による工期の短縮等)

1. 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2. 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3. 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

#### 第23条(工期の変更方法)

1. 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2. 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

#### 第24条(請負代金額の変更方法)

1. 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から28日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2. 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3. この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

#### 第25条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

1. 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不相当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2. 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相当する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3. 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から28日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。
4. 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5. 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6. 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7. 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から28日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。
8. 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

#### 第26条(臨機の措置)

1. 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かななければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2. 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3. 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合においては、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4. 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと発注者が認める部分については、発注者が負担する。
